
TCSA Porto Sul

3º Relatório de Execução

Comitê Técnico de Execução - CTE



Foto: Rui Rezende – Rio Almada

3º Relatório de Execução

TCSA Porto Sul

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 3º Relatório de Execução acerca do cumprimento das obrigações estipuladas para o primeiro e segundo anos de cumprimento do TCSA, referentes às ações previstas no Eixo 1 – Planejamento Territorial (item 1), Eixo 2 – Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4, 5, 6 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental Integrada (itens 10, 11, 12 e 13), no Eixo 4 – Fortalecimento da Fiscalização (itens 14 e 15), no Eixo 5 – Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 18, 19, 22, 23, 25 e 29) e no Eixo 7 – Governança Ambiental (item 34), considerando a proposição de atualização do Plano de Ações (ANEXO I) e Parecer Técnico (ANEXO II).

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 33. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, especialmente em virtude de dificuldades e imprevistos operacionais inerentes ao gerenciamento de qualquer projeto.

Na oportunidade, nos termos da CLÁUSULA 6ª, inciso V, comunicamos aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS intercorrências que podem interferir na execução adequada das obrigações/ações previstas no Eixo 2 – Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3 e 4), visto que metade das plataformas de coleta de dados (PCD), instaladas na região de abrangência do projeto Porto Sul, ainda em fase de teste, perderam o sinal de transmissão de dados após as fortes chuvas ocorridas no sul e extremo sul do Estado.

Comunicamos, ainda, aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS, nos termos da CLÁUSULA 29ª, que a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação veículos em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis.

Ademais, informamos o comprometimento de R\$ 11.434.370,54 (onze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) **correspondente a 68% (sessenta e oito por cento)** do montante R\$ 16.883.941,05 (dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO. Ante o exposto, este Comitê Técnico de Execução (CTE) entende pelo alcance do percentual mínimo de execução referido no Parágrafo Terceiro da CLÁUSULA 27ª, possibilitando o pagamento da parcela subsequente.

Quadro 1 - Descrição das ações em execução

EIXO	ITEM / AÇÕES	STATUS	Nº do CONTRATO
1	ITEM 01: Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Termo de Referência em elaboração	-
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	Contrato firmado <i>Equipamentos em fase de teste</i>	080/2021
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	Contrato firmado <i>Equipamentos em fase de teste</i>	
	ITEM 05: Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	Em contratação	-
	ITEM 06: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	Em contratação	-
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	Contrato firmado	105/2021
3	ITEM 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contrato firmado <i>Contratação unificada com o item 12</i>	116/2021
	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	Contrato firmado	121/2021
	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	Contrato firmado <i>Contratação unificada com o item 10</i>	116/2021
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	Contratos firmados <i>Necessidade de adequação aos recursos financeiros disponíveis</i>	063/2021, 064/2021, 073/2021
Software Virtualização <i>Em contratação</i>		-	
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual.	Aquisições em andamento <i>Necessidade de adequação aos recursos financeiros disponíveis</i>	-
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	Aquisições em andamento <i>Necessidade de adequação aos recursos financeiros disponíveis</i>	-

5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Contratos firmados	019/2021 049/2022
	ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Termo de Referência em elaboração <i>Aguardando projetos complementares que subsidiarão a contratação da obra da sede</i>	-
	ITEM 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Termo de Referência em elaboração <i>Proposta de contratação unificada, objetivando a realização de um planejamento territorial integrado</i>	-
	ITEM 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande		
	ITEM 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru		
ITEM 29: Aquisição de bens e/ou contratação de serviços para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	<i>Aguardando ICMBio enviar planejamento</i>	-	
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	Repasses efetuados	005/2021

Quadro 2– Discriminativo dos valores comprometidos

EIXO	ITEM / AÇÕES	Valor estimado (R\$)	Valor comprometido (R\$)	Descrição
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	198.300,00	166.050,00	PCD Hidrológicas
		99.150,00	107.775,00	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	232.500,00	270.100,00	PCD Pluviométricas
		116.250,00	179.625,00	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	686.400,00	981.205,88	Geoprocessamento - HARPIA
3	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	975.000,00	1.324.284,48	Desenvolvimento de sistemas - SEIA

	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	1.560.000,00	2.041.160,40	Desenvolvimento de software
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	1.393.400,00	35.970,74	02 (duas) Mesas digitalizadoras
			10.000,00	Solução de Segurança WAF
			258.065,39	Solução de Segurança WAF
			52.527,00	03 (três) Switch tipo borda
			137.816,00	02 (dois) Switch core 48 portas
			87.190,10	02 (dois) Switch core 24 portas
			22.500,00	Switch instalação/Treinamento/Suporte técnico
			275.000,00	01 (um) Storage
			155.000,00	01 (um) Storage
			134.505,00	01 (um) Switch core
			84.240,00	01 (um) Switch servidor
	12.000,00	Serviços switches		
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal e estadual.	1.141.100,00	46.427,85	01 (um) Computador (workstation)
			42.090,00	01 (um) Quadriciclo
			2.630,00	Serviços de frete para 01 (um) Quadriciclo
			715.068,00	03 (três) Veículos pick-up 4x4
			29.415,05	Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de acidente, licenciamento e IPVA para 03 (três) Veículos pick-up 4x4
			28.000,00	25 (vinte e cinco) Monitores
			26.550,00	10 (dez) Tablet
			4.400,00	02 (duas) Impressoras
			4.226,00	01 (um) Nobreak3Kva
			169.775,00	25 (vinte e cinco) Computadores
			82.000,00	10 (dez) Notebook
	15.582,00	02 (dois) Notebook avançado		

			21.384,00	03 (três) Notebook intermediário
			82.650,00	01 (um) Receptor GNSS
			2.800,00	10 (dez) Power bank (para Tablet)
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	539.000,00	476.712,00	02 (dois) Veículos pick-up 4x4
			23.867,38	Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de acidente, licenciamento e IPVA para 02 (dois) Veículos pick-up 4x4
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	2.000.000,00	213.440,00	Projetista/fiscal para cercamento e infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha
			1.273.539,10	Serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	150.186,56	150.186,56	Repasse ao Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia
-	Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)	1.576.958,84	1.688.394,11	Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de Cooperação nº 002/2020
-	Taxas bancárias	-	218,50	Taxas bancárias
TOTAL ==>		9.767.126,06	11.434.370,54	==>68% do montante depositado

DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS

Em atendimento ao disposto nas CLÁUSULAS 14^a e 15^a, o PRIMEIRO e o SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS deram seguimento às tratativas junto às entidades e aos órgãos de fiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro (CIPPA/Porto Seguro) e a Delegacia de Proteção Ambiental de Ilhéus (DPA) foram convidadas a aderir PROTOCOLO e/ou a participar do planejamento e realização de operações e demais ações relacionadas.

Cumprir ressaltar que os Municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) formalizaram o interesse no sentido de promover a assinatura de Termo de Adesão ao supracitado PROTOCOLO, efetuando a indicação dos bens e serviços adquiridos com o recurso disponível nos itens 14 e 15 (Eixo 4) do Plano de Ações (Anexo 3).

Na oportunidade, em atenção ao disposto na CLÁUSULA 16^a, informamos a realização pelo SEGUNDO COMPROMISSÁRIO de 19 (dezenove) ações de fiscalização, referentes a processos de Operações Planejadas formados em atendimento ao compromisso firmado no referido PROTOCOLO, contemplando os eixos temáticos fauna silvestre, recursos minerais e vegetação nativa.

Ademais, em atendimento ao disposto na CLÁUSULA 21^a, registramos que foi formado e ainda encontra-se sob análise o processo de fiscalização para verificação do cumprimento dos condicionantes da Portaria INEMA n° 22.102/2021, que concedeu à Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) a Autorização de Supressão da Vegetação Nativa (ASV) em uma área de 17,00 hectares no município de Ilhéus, bem como Licença de Implantação (LI) para instalação de projeto de melhoria de infraestrutura logística e viária da BA-262 e Autorização para Manejo de Fauna (AMF), relacionadas ao Licenciamento Ambiental da requalificação da interseção da BA 262 e acesso à estrada de Itariri, à altura do ponto de coordenada UTM 24L 484.775/8.373.678 e extensão de 2,7 km (via de acesso ao Porto Sul) (Processo n° 2020.001.004926/INEMA/LIC-04926).

DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO

Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Parágrafo Segundo, o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO efetivou, em 31/08/2021, o pagamento da segunda parcela no montante de R\$ 10.041.128,61 (dez milhões, quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), compreendendo os R\$ 9.011.193,36 (nove milhões, onze mil cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos) previstos somados a R\$ 1.029.935,25 (um milhão, vinte e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) transferidos a título de atualização monetária.

DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO

O QUARTO COMPROMISSÁRIO avaliou o 1º Relatório Parcial das atividades desenvolvidas pelo Secretário Executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, comunicando a este Comitê Técnico de Execução (CTE) e ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) a aprovação da prestação de contas do OBSERVATÓRIO SOCIAL, no cumprimento CLÁUSULA 25ª, inciso V, do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, possibilitando a liberação da segunda parcela prevista no item 34 (Eixo 7) do Plano de Ações (Anexo 3), totalizando o montante de R\$ 150.186,56 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) repassados ao OBSERVATÓRIO SOCIAL.

.

DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O presente detalhamento foi realizado com base na 3ª Prestação de Contas, encaminhada em 29/12/2021 e atualizada em 04/03/2022 pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), conforme determinação trazida pela CLÁUSULA 33ª, que contém os documentos financeiros referentes ao período compreendido entre 01 de agosto de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

Ressaltamos que ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 3519-X, o montante de R\$ R\$ 6.842.812,44 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) e o montante de R\$ 10.041.128,61 (dez milhões, quarenta e um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), referentes à primeira e segunda parcelas, respectivamente, totalizando R\$ 16.883.941,05 (dezesesseis milhões, oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO, foram aplicados em duas carteiras apresentando rentabilidade líquida de R\$ 586.591,68 (quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) acumulados.

Gráfico 1 – Aportes Efetivados (em R\$)


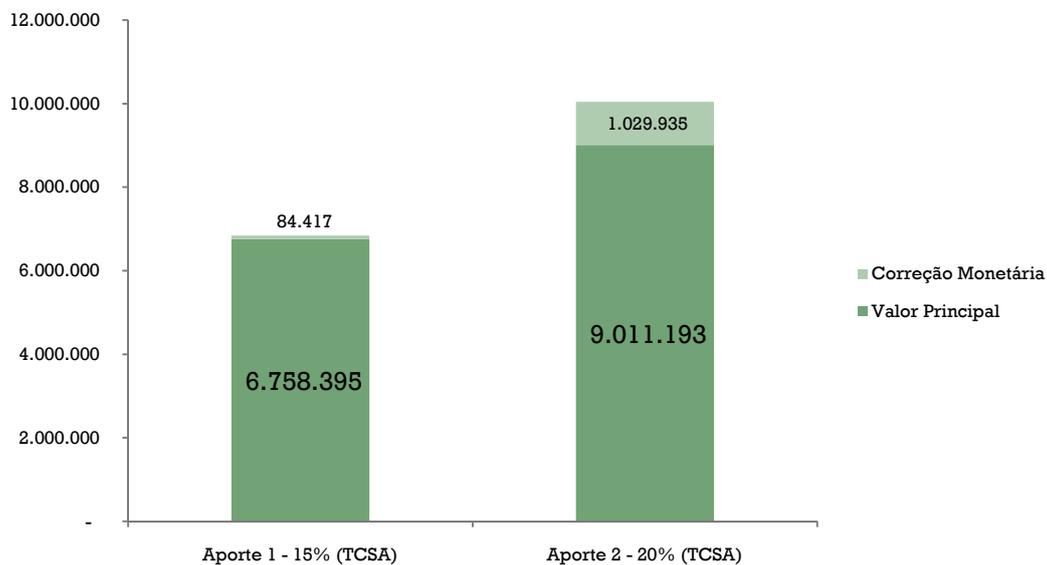


Gráfico 2 – Rendimento de Aplicação (em R\$)

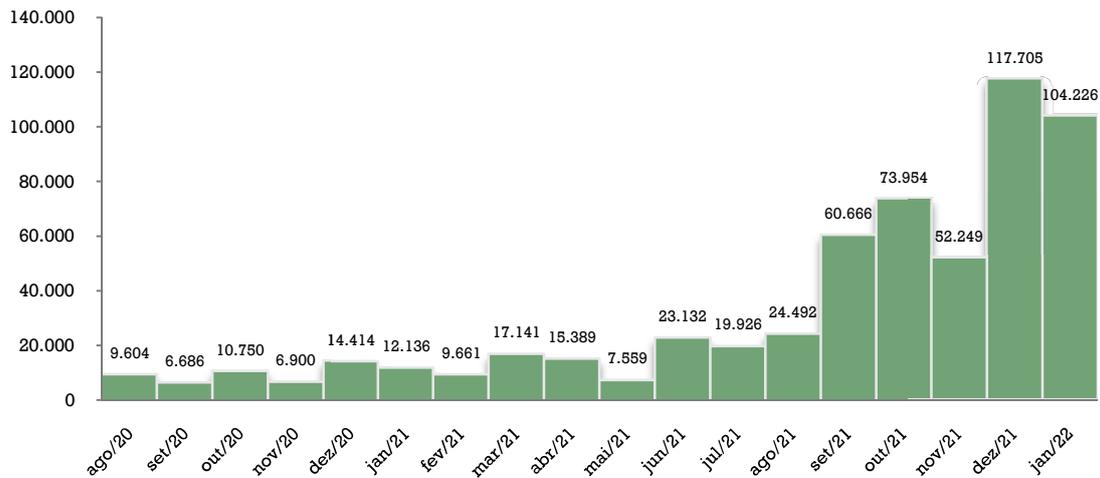

Durante o período relatado houve o débito no montante de R\$ 4.227.089,95 (quatro milhões e duzentos e vinte e sete mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) segundo período, que somados com o débito R\$ 681.467,76 (seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) dos períodos anteriores, totalizam R\$ 4.908.557,71 (quatro milhões e novecentos e oito mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) debitados, restando comprometido contratualmente o montante de R\$ 6.525.812,83 (seis milhões e quinhentos e vinte e cinco mil e oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos), totalizando R\$ 11.434.370,54 (onze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) executados, o que corresponde a 68% (sessenta e oito por cento) do montante total depositado.

Gráfico 3 – Total Comprometido x Aportado (em R\$)

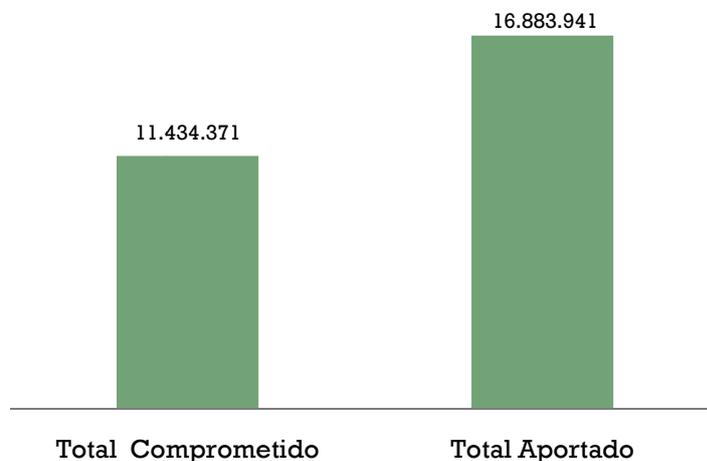


Tabela 1 – Percentual de Execução do TCSA

Total	R\$
Comprometido	11.434.371
Aportado	16.883.941
Percentual de Execução	68%

ANEXO I - Plano de Ações Atualizado

AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência	R\$3.500.000,00		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00			
Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	R\$2.000.000,00			R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00		
Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos	R\$297.450,00	R\$297.450,00					
Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos	R\$348.750,00	R\$348.750,00					
Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	R\$770.000,00		R\$770.000,00				
Item 6 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	R\$390.000,00		R\$390.000,00				
Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	R\$780.000,00				R\$780.000,00		
Item 08 - Aquisição de serviço de imagens de alta resolução	R\$961.920,00			R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00
Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal	R\$2.059.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00

Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	R\$1.560.000,00				R\$780.000,00	R\$780.000,00	
Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais denominada SEIA	R\$3.900.000,00		R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00		
Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$3.120.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00			
Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema)	R\$1.393.400,00	R\$ 1.393.400,00					
Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	R\$1.141.100,00	R\$570.550,00	R\$ 570.550,00				
Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	R\$539.000,00		R\$ 539.000,00				
Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	R\$500.000,00				R\$500.000,00		
Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$1.000.000,00				R\$1.000.000,00		
Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00					
Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00					
Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$200.000,00					R\$ 200.000,00	
Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$200.000,00					R\$ 200.000,00	

Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$400.000,00		R\$400.000,00				
Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$100.000,00					R\$ 100.000,00	
Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$325.000,00				R\$ 325.000,00		
Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$325.000,00				R\$ 325.000,00		
Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$1.100.000,00						R\$ 1.100.000,00
Item 29 - Destinação de recursos para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	R\$6.000.000,00		R\$ 1.200.000,00				
Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para adequação do CETAS Marinho	R\$400.000,00				R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho	R\$1.835.037,60					R\$917.518,80	R\$917.518,80
Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção do CETAS Marinho	R\$200.000,00					R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação	R\$1.403.952,87			R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	
Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental	R\$450.559,67	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28
TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES	R\$ 40.550.370,14	R\$ 6.418.443,28	R\$ 9.377.843,28	R\$ 8.916.757,57	R\$ 6.056.757,57	R\$ 4.706.757,57	R\$ 5.073.810,88
TOTAL PREVISTO	R\$ 45.055.966,82	R\$ 6.758.395,02	R\$ 9.011.193,36	R\$ 9.011.193,36	R\$ 6.758.395,02	R\$ 6.758.395,02	R\$ 6.758.395,02
TOTAL DEPOSITADO	R\$ 16.883.941,05	R\$ 6.842.812,44	R\$ 10.041.128,61				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%)	R\$ 1.688.394,11	R\$ 684.281,24	R\$ 1.004.112,86				
RENDIMENTO	R\$586.591,68	R\$76.316,99	R\$510.274,69				

LEGENDA	
	Sem alterações
	Sugestão de remanejamento (supressão)
	Sugestão de remanejamento (inclusão)
	Sugestão de redistribuição de valores
	Montantes comprometidos

ANEXO II – Parecer Técnico

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 e 33. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, especialmente em virtude de dificuldades e imprevistos operacionais inerentes ao gerenciamento de qualquer projeto.

ITEM 1

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL Produção de Dados Primários de Uso e Ocupação do Solo e Vegetação	Item 1 – Fortalecimento Dos Corredores Ecológicos – Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Contratação de serviço para a realização da caracterização socioambiental de imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio Almada e da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra Grande, <u>para subsidiar ações de regularização ambiental, preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites legalmente estabelecidos e recuperação de áreas degradadas.</u> Para a caracterização socioambiental deverão ser coletados dados geoespaciais de pontos relevantes, como os limites individualizados dos imóveis, as Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal; as áreas habitadas, com especificação das formas de utilização da terra nestas áreas, as quais serão utilizadas para a confecção de mapas temáticos e como subsídio para o planejamento, indicando eventuais incompatibilidades entre os objetivos e zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental (APA).			R\$3.500.000,00 / 4 R\$875.000,00 por parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	/	/	/

JUSTIFICATIVAS:

Considerando o levantamento de dados primários visando o fortalecimento do corredores ecológicos na Região de Referência deste Termo de Compromisso Socioambiental - TCSA possui estreita relação com proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado, entendemos que a redistribuição de valores se faz necessária, para possibilitar o levantamento conjunto dos dados primários que serão produzidos no item 1 (uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água).

Na oportunidade, esclarecemos que se encontra em andamento a atualização tecnológica do Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA para possibilitar a recepção dos dados primários que serão produzidos.

ITEM 7

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 07 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação envolvendo um Time de desenvolvimento por 12 meses, para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal com enfoque na região de referência. OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$1.560,00 / 2 R\$ 780.000,00 por parcela
ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00	/	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	/	R\$ 780.000,00	/	/

JUSTIFICATIVAS:

Considerando a previsão de execução de projeto interno que contempla a atualização inicial do aplicativo do TerraAmazon, a realocação de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) proposta do item 7 para o item 11 busca uma melhor execução dos recursos financeiros disponíveis.

Não obstante, importante ressaltar que a alteração proposta não implicará em prejuízo nas atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da cobertura vegetal prevista no item 9, com início no ano 01.

ITEM 10

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação por 24 meses para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos com enfoque na região de referência, com o objetivo de detectar, alertar e publicar de maneira contínua, sistemática e didática, áreas com provável decréscimo de vegetação nativa e pontos com redução da qualidade/quantidade da água, orientando e munindo os agentes de fiscalização ambiental a que se refere o TCSA, de informações de alta precisão. OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$1.560.000,00 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil reais) /2 R\$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais a parcela)
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	R\$780.000,00	R\$780.000,00	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	/	R\$780.000,00	R\$780.000,00	/

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que o desenvolvimento do Painel de Monitoramentos previsto no item 10, por sua natureza de utilização de dados e informações espaciais, depende do prévio aprimoramento da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG-Geobahia) previsto no item 12, entendemos como necessária a prorrogação sugerida, sem prejuízos aos monitoramentos previstos no TCSA, que, cumpre esclarecer, serão realizados pela execução imediata dos itens 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

Diante do exposto, além do remanejamento dos valores inicialmente previstos, efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 12, para possibilitar a contratação conjunta por um período mínimo de 60 meses.

ITEM 11

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA	Item 11 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma SEIA	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 24 meses) para aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA, de maneira a tornar mais consistente com posterior publicização as informações sobre os empreendimentos licenciados pelo Estado com enfoque na região de referência.			R\$3.120.000,00 / 2
Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental					
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	/	/	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	/	/

JUSTIFICATIVAS:

Em razão da complexidade e especificidade, e visando garantir a devida evolução necessária da plataforma do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA às demandas deste TCSA Porto Sul, procedemos com a contratação de um time ágil – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste, por 36 (trinta e seis) meses.

Importante reforçar que diante do aquecimento do mercado de TIC, se apresentou necessário o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – “Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal.

ITEM 12

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 12 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 48 meses) para aprimoramento das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com a inserção das informações específicas da região de referência sobre regras de uso e ocupação do solo, bem como das áreas restritas, com a respectiva melhoria de escala, de modo a subsidiar a gestão ambiental e a tomada de decisão.			R\$3.120.000,00 / 2
		<ul style="list-style-type: none"> • A integração das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com emissão permanente de alertas <i>on line</i> de supressão de vegetação, aos COMPROMITENTES e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO; • Publicação contínua e sistemática das áreas de decréscimo de vegetação, em especial a nativa, nas UCs e nas áreas de referência, entre todos os Entes Federativos e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO. Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	/	/	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$1.040.000	R\$1.040.000	R\$1.040.000	/	/	/

JUSTIFICATIVAS:

Considerando que a reestruturação da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SIG-Geobahia) alicerçará todos os demais projetos que por sua natureza utilizarão os dados e informações espaciais, imprescindível o início imediato do item 12 nos anos 01 a 03, para permitir não somente a publicação dos dados e informações geoespaciais do Item 10 (Painel de Monitoramentos), como também a operacionalização dos Itens 01 (CEFIR), 09 (Monitoramento da Cobertura Vegetal) e 11 (SEIA – Dados Espaciais).

Diante do exposto, além da redistribuição dos valores inicialmente previstos entre as parcelas, efetivamos a contratação do serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais de forma unificada com o item 10, para possibilitar a contratação conjunta por um período mínimo de 60 meses.

ITEM 14

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 14 – Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação de todos os seguimentos responsáveis pela fiscalização na região de referência, quais sejam, IBAMA, ICMBIO, INEMA, DPA.			R\$ 1.141.100,00 / 3 R\$380.366,67 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67			
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 550.570,00	R\$ 550.570,00				

JUSTIFICATIVA:

Os valores correspondentes ao item 14 foram remanejados para a adequação às disponibilidades orçamentárias e antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos.

Contudo, a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação veículos em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis.

ITEM 15

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 15 – Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação dos órgãos ambientais dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré.			R\$ 539.000,00 / 2 R\$ 269.500,00 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$269.500,00	R\$269.500,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 539.000,00				

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 15 para o ano 2.

ITEM 16

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 16 – Aquisição de bens para estruturação da Polícia Rodoviária Federal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a estruturação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para fiscalização na região de referência, sobretudo tráfico de madeira e de animais. OBS.: Animais ameaçados de extinção da lista vermelha, competência da Justiça Federal.			R\$ 500.000,00 / 2 R\$250.000,00 a parcela a ser dividida entre as duas Polícias.
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$250.000,00	R\$250.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$500.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 16 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, no valor estimado de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação.

ITEM 17

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 17 – Apoio estruturante ao Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação do Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus.			R\$1.000.000,00 / 2 R\$ 500.000,00 a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$ 1.000.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 15 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 17 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro – CIPPA/Porto Seguro, no valor estimado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de prorrogação da ação.

ITENS 18 E 19

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 18 – Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.			R\$2.000.000,00
	Item 19 – Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	Contratação de serviço de engenharia para construção da Sede do Parque Estadual da Ponta da Tulha para a Gestão, com uma estrutura mínima para atender aos prestadores de serviços e um pequeno receptivo.			R\$350.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 18)	ANO 2 (Item 18)	ANO 3 (Item 18)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 18)	ANO 6 (Item 18)
/	R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00	/	/	/
ANO 1 (Item 19)	ANO 2 (Item 19)	ANO 3 (Item 19)	ANO 4 (Item 19)	ANO 5 (Item 19)	ANO 6 (Item 19)
R\$350.000,00	/	/	/	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1 (Item 18)	ANO 2 (Item 18)	ANO 3 (Item 18)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 18)	ANO 6 (Item 18)
R\$2.000.000,00	/	/	/	/	/
ANO 1 (Item 19)	ANO 2 (Item 19)	ANO 3 (Item 19)	ANO 4 (Item 18)	ANO 5 (Item 19)	ANO 6 (Item 19)
R\$350.000,00	/	/	/	/	/

JUSTIFICATIVA:

Considerando o avanço das tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para o início da recuperação de áreas degradadas no interior do Parque Estadual da Ponta da Tulha com recursos externos ao TCSA, e com o intuito de obter economia nas contratações de serviços de engenharia para o cercamento e infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha, recomendamos que as contratações dos itens 18 e 19 sejam realizadas de maneira unificada, com a possibilidade de início imediato, a partir da antecipação do serviço de cercamento anteriormente previsto para os anos 2 e 3, com vistas a conter o avanço das invasões que poderiam prejudicar o sucesso das ações de recuperação supracitadas.

ITENS 22, 23 e 25

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado.			R\$500.000,00
	Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.			R\$400.000,00
	Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	Contratação de serviço gráfico para as ações de demarcação e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru, de acordo com as descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.			R\$500.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
 	 	R\$500.000,00	 	 	
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
 	 	R\$400.000,00	 	 	
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
 	 	R\$500.000,00	 	 	
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
 	R\$500.000,00	 	 	 	
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
 	R\$400.000,00	 	 	 	
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
 	R\$500.000,00	 	 	 	

JUSTIFICATIVA:

Proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado.

ITEM 33

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO						
ESPECIFICAÇÕES						
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS	
EIXO 6: MEDIDA DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO COMPLEMENTAR À FAUNA/FLORA	Item 33 Contratação de serviço de recomposição de vegetação	– de de	Contratação de serviço para executar a recomposição de 100 (cem) hectares de vegetação, relacionado ao plantio compensatório complementar, considerando a supressão de, no máximo, 484 ha (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares de vegetação durante a fase de implantação do empreendimento.			R\$ R\$1.403.952,87/ 3 R\$467.984,29a parcela
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA						
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	
/	/	/	R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE						
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	
/	/	R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	/	

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de antecipação do início das ações relacionadas à recomposição de vegetação nativa da Mata Atlântica equivalente ao montante complementar de 100 ha (cem hectares) por meio da execução das medidas previstas no Item 33 (Eixo 6), objetivando o atendimento da execução no prazo máximo de até 05 (cinco) anos a contar da homologação do TCSA, nos termos da CLÁUSULA 20ª.
