



TCSA Porto Sul

4º Relatório de Execução



Comitê Técnico de Execução - CTE

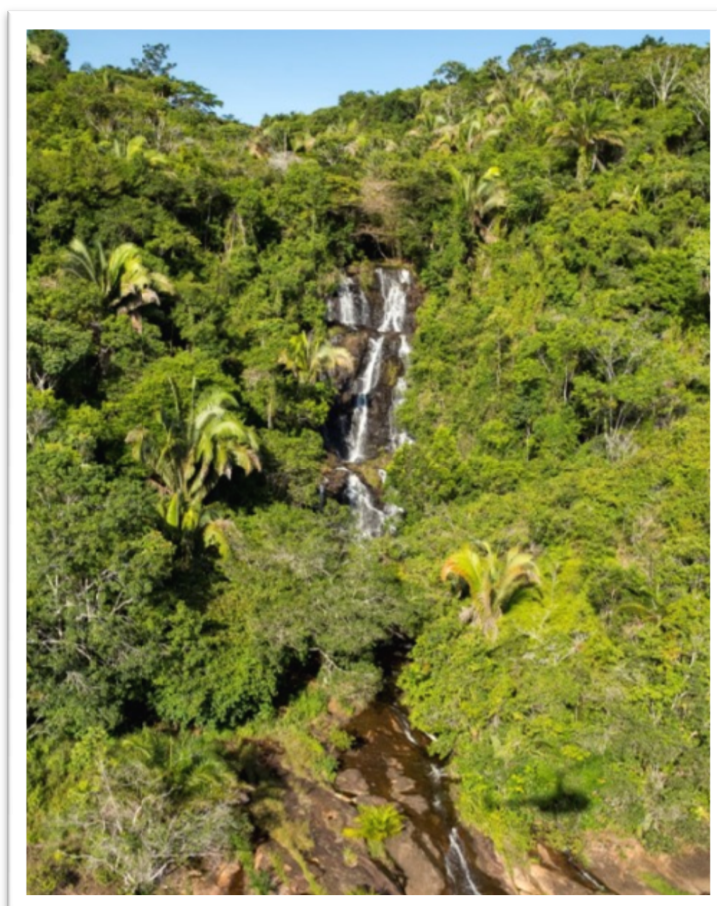


Foto: Rui Rezende



4º Relatório de Execução

TCSA Porto Sul

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 4º Relatório de Execução acerca das obrigações estipuladas para o primeiro e segundo anos de cumprimento do TCSA, referentes às ações previstas no Eixo 1 – Planejamento Territorial (item 1), Eixo 2 – Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4, 5, 6 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental Integrada (itens 10, 11, 12 e 13), no Eixo 4 – Fortalecimento da Fiscalização (itens 14 e 15), no Eixo 5 – Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 e 29) e no Eixo 7 – Governança Ambiental (item 34), considerando a proposição de atualização do Plano de Ações (ANEXO I) e Parecer Técnico (ANEXO II).

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29 e 33. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes de cronograma, especialmente em virtude de gerenciamento de qualquer projeto.

Na oportunidade, nos termos da CLÁUSULA 6ª, inciso V, comunicamos aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS intercorrências que podem interferir na execução adequada das obrigações/ações previstas no Eixo 2 – Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3 e 4), especificamente a queima de um sensor de nível de uma das plataformas de coleta de dados (PCD) e a baixa transmissão de dados em duas das plataformas de coleta de dados (PCD) instaladas na região de abrangência do projeto Porto Sul, após as fortes chuvas ocorridas no sul e extremo sul do Estado. Ainda sobre este tema, há que se dizer que as contratações previstas para os itens 5 e 6 que se encontravam em fase avançada, tiveram que retornar para redefinição dos Termos de Referência, pois durante a apresentação de propostas foram verificados valores até duas vezes maiores que o quanto estimado no bojo do TCSA.

Ademais, esclarecemos que ainda se encontra em tramitação no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o Processo SEI ICMBio nº 02124.001690/2021-86 para tratativas referentes ao Protocolo de Fiscalização Ambiental Integrada, especialmente ao item 14 (Eixo 4) do Anexo 3 - Plano de Ações e ao Anexo 4 - Projeto Preliminar Estruturante, bem como ao item 29 do Eixo 5 (Consolidação Territorial de Unidades de Conservação) com indicativo de estabelecimento de instrumento jurídico a ser firmado entre o ICMBio e o FUNBIO, seguindo os trâmites organizacionais do órgão federal.

Ratificamos, ainda, aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS, nos termos da CLÁUSULA 29ª, que houve variação cambial em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços dos itens 13, 14 e 15, base 2018, comprometendo a aquisição do conjunto de equipamentos que compõem as especificações dos itens supracitados, exigindo a deliberação do Comitê Técnico de Execução (CTE) para adequação e suplementação com

recursos oriundos dos rendimentos mensais decorrentes das aplicações (em conta) dos aportes anuais para sua aquisição, nos termos da CLÁUSULA 28ª.

Não obstante, registramos o comprometimento de R\$17.868.835,26 (dezesete milhões oitocentos e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), correspondente a 105,83% (cento e cinco, oitenta e três por cento) do montante de R\$16.883.941,05 (dezesesseis milhões oitocentos e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

No que concerne ao total de despesas pagas, registramos o correspondente a R\$8.729.598,06 (oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e seis centavos), equivalentes a 51,70% (cinquenta e um, setenta por cento) do montante depositado pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

Ante o exposto, este Comitê Técnico de Execução (CTE) entende pelo alcance do percentual mínimo de execução referido no Parágrafo Terceiro da CLÁUSULA 27ª, possibilitando o pagamento da parcela subsequente, ou seja, do terceiro desembolso.

Quadro 1 - Descrição das ações em execução

EIXO	ITEM / AÇÕES	STATUS	Nº do CONTRATO
1	ITEM 01: Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Termo de Referência em elaboração	-
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	Contrato firmado <i>Equipamentos em fase de teste</i>	080/2021-ATIVA
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	Contrato firmado <i>Equipamentos em fase de teste</i>	
	ITEM05: Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	Termo de Referência em adequação	-
	ITEM 06: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	Termo de Referência em adequação	-
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	Contrato firmado	105/2021-GEOAMBIENTE
3	ITEM 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contrato firmado <i>Contratação unificada com o item 12</i>	106/2021-AVANSYS
	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	Contrato firmado	121/2021-AVANSYS
	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	Contrato firmado <i>Contratação unificada com o item 10</i>	106/2021-AVANSYS
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	Contratos firmados <i>Necessidade de adequação aos recursos financeiros disponíveis</i>	063/2021, 064/2021, 073/2021
Software Virtualização <i>Em contratação</i>		-	
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual.	Aquisições em andamento <i>Necessidade de adequação aos recursos financeiros disponíveis</i>	-
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	Aquisições em andamento <i>Necessidade de adequação aos recursos financeiros disponíveis</i>	

5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Contratos firmados	119/2021 Peixoto Monteiro Eng Ltda- 049/2022 ENGETELA COM e SERV EIRELI
	ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Em contratação	-
	ITEM 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Termo de Referência em elaboração <i>Proposta de contratação unificada, objetivando a realização de um planejamento territorial integrado</i>	-
	ITEM 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande		
	ITEM 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru		
	ITEM 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha		
	ITEM 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru		
	ITEM 29: Aquisição de bens e/ou contratação de serviços para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	<i>Aguardando ICMBio enviar planejamento</i>	-
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	Repasses efetuados (1ª e 2ª parcelas)	005/2021 - Associação Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia

**Quadro 2– Discriminativo dos valores comprometidos e pagamentos efetuados:
(Considerando valores acumulados até 30/09/2022)**

EIXO	ITEM / AÇÕES	Valor estimado (R\$) ANO-1 + ANO 2	Valor Comprometido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição	
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	198.300,00	166.050,00	166.050,00	PCD Hidrológicas	
		99.150,00	107.775,00	91.775,00	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento	
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	232.500,00	270.100,05	270.100,01	PCD Pluviométricas	
		116.250,00	179.625,00	24,99	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento	
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	686.400,00	1.816.571,38	687.202,39	Geoprocessamento - HARPIA	
3	ITEM 10: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para desenvolvimento do painel de monitoramentos	1.560.000,00	1.756.248,43	-	contrato 106/201	
		ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	1.300.000,00	3.972.853,44	812.339,72	Desenvolvimento de sistemas - SEIA
			ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	2.080.000,00	3.261.604,22	1.035.458,05
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	1.393.400,00	35.970,74	35.970,74	35.970,74	02 (duas) Mesas digitalizadoras
			52.527,00	52.527,00	52.527,00	03 (três) Switch tipo borda
			258.066,39	258.065,39	258.065,39	Solução de Segurança WAF
			10.000,00	9.000,00	9.000,00	Solução de Segurança WAF
			137.816,00	137.816,00	137.816,00	02 (dois) Switch core 48 portas
			87.190,10	87.190,10	87.190,10	02 (dois) Switch core 24 portas
			22.500,00	9.000,00	9.000,00	Switch instalação/Treinamento/Suporte técnico
			275.000,00	275.000,00	275.000,00	01 (um) Storage
			155.000,00	155.000,00	155.000,00	01 (um) Storage
			134.505,00	-	-	01 (um) Switch core
84.240,00	-	-	01 (um) Switch servidor			
12.000,00	-	-	Serviços switches			
82.844,21	82.844,21	82.844,21	Gerenciador de logs			
10.000,00	7.000,00	7.000,00	Instalação/Treinamento/Suporte tec de hardware			
4	ITEM 14: Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal e estadual.	1.141.100,00	46.427,85	23.213,92	01 (um) Computador (workstation)	
		476.712,00	476.712,00	476.712,00	02 (dois) Veículos pick-up 4x4	
		42.090,00	42.090,00	42.090,00	01 (um) Quadriciclo	

			2.630,00	2.630,00	Serviços de frete para 01 (um) Quadriciclo
			169.775,00	169.775,00	25(vinte e cinco) computadores
			11.999,00	11.999,00	01 (um) Notebook - geo
			4.400,00	4.400,00	02(duas) Impressoras A4
			26.550,00	26.550,00	10 (dez) Tablet
			28.000,00	28.000,00	25 (vinte e cinco) Monitores
			82.000,00	41.000,00	10 (dez) Notebook
			7.280,00	7.280,00	01(um) scanner
			82.650,00	82.650,00	01 (um) Receptor GNSS
			4.900,00	4.900,00	No Break/estabilizador
			8.240,00	-	02(duas) Impressoras PORTÁTIL
			2.800,00	2.800,00	10 (dez) Power bank (para Tablet)
			15.582,00	15.582,00	02 (dois) Notebook avançado
			21.384,00	21.384,00	03 (três) Notebook intermediário
			22.532,00	22.532,00	04 (quatro) Notebook intermediário
			24.554,43	23.991,84	Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de acidente, licenciamento e IPVA para 02 (dois) Veículos pick-up 4x4
			715.068,00	715.068,00	03 (três) Veículos pick-up 4x4
	ITEM 15: Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência.	539.000,00	36.336,07	36.336,07	Serviços de frete, armazenagem, seguro de roubo, seguro de acidente, licenciamento e IPVA para 03 (três) Veículos pick-up 4x4
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	2.000.000,00	213.440,00	124.190,00	Projetista/fiscal para cercamento e infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha
			1.358.039,10	834.934,00	Serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	150.186,56	150.186,56	150.186,56	Repasse ao Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia
	Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)	1.576.958,84	1.426.772,29	1.576.958,86	Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de Cooperação nº 002/2020
	Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)- correção monetária			111.435,21	Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de Cooperação nº 002/2020
	TARIFAS BANCÁRIAS			636,00	acumulado 31/08/2022
TOTAL ==>		13.073.245,40	17.868.835,26	8.729.598,06	==> 51,70% do montante depositado

DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS

Em atendimento ao disposto nas CLÁUSULAS 14^a e 15^a, o PRIMEIRO e o SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS deram seguimento às tratativas junto às entidades e aos órgãos defiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF), a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro (CIPPA/Porto Seguro), a Delegacia de Proteção Ambiental/Ilhéus (DPA/Ilhéus) e os Municípios de Itacaré e Uruçuca formalizaram a adesão ao referido PROTOCOLO.

Cumprido ressaltar que o Município de Ilhéus, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) indicaram o interesse de promover a assinatura de Termo de Adesão ao supracitado PROTOCOLO, contudo não avançaram nesse sentido.

Ademais, em atendimento ao disposto na cláusula 16^a, informamos da realização pelo SEGUNDO COMPROMISSÁRIO das ações de fiscalização nos municípios incluídos na Região de Referência do TCSA Porto Sul, quais sejam, Aurelino Leal, Barro Preto, Coaraci, Floresta Azul, Ibicarai, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itapitanga, Maraú e Uruçuca. Foram obtidos através da consulta aos Sistemas SEI e CERBERUS, em pesquisa realizada para os meses de junho a setembro do presente ano, o quantitativo de 22 denúncias recebidas, sendo deste quantitativo, 14 identificadas, conforme Lei Complementar nº 140/2011, como de competência municipal e direcionadas mediante envio de Ofício, conforme previsto no PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA do TCSA Porto Sul. Cabe registrar, ainda, que foram recebidas demandas judiciais do Ministério Público Federal e Estadual, em análise e atendimento pelos técnicos da fiscalização tanto da Sede quanto da Unidade Regional Sul.

Adiciona-se a este levantamento a realização de operações planejadas nos temas Fauna e Florestal, ocorrendo em Junho a Operação de Combate ao Desmatamento na Mata Atlântica em Itacaré e Uruçuca; em Agosto a Operação Fauna Porto Sul, fiscalização visando o combate, captura, comercialização e tráfico ilegal de espécies da fauna nativa; e no período de 18 a 24/09, Operação Harpia, operação de fiscalização visando o combate ao desmatamento ilegal do bioma Mata Atlântica com o uso dos dados de alerta do Programa Harpia, nos municípios Ilhéus, Itacaré e Uruçuca. A partir dessas operações, identificou-se, dentre outros, ilícito de supressão de vegetação nativa em áreas de cultivo sob o sistema agroflorestal cacau Cabruca. Os dados gerados pelo monitoramento do Programa Harpia serão posteriormente tratados, com as informações coletadas em campo, utilizados para subsidiar a atuação das equipes de fiscalização na validação das áreas de Cabruca e análise do CEFIR. Ante o exposto, ressaltamos que até a presente data foram realizadas 06 operações relacionadas ao Protocolo de Fiscalização Porto Sul, nos temas Florestal, Fauna e Mineração, sendo estas:

Julho/2021 – Operação Harpia Porto Sul, fiscalização visando o combate ao desmatamento ilegal do bioma Mata Atlântica.

Julho/2021 – Operação Fauna Porto Sul, fiscalização visando o combate, captura, comercialização e tráfico ilegal de espécies da fauna nativa.

Setembro/2021 – Operação Extração, fiscalização visando o combate à extração irregular de minério.

Junho/2022 – Operação Desmatamento da Mata Atlântica em Itacaré e Uruçuca.

Agosto/2022 – Operação Fauna Porto Sul, fiscalização visando o combate, captura, comercialização e tráfico ilegal de espécies da fauna nativa.

Setembro/2022 – Operação Harpia Porto Sul, fiscalização visando o combate ao desmatamento ilegal do bioma Mata Atlântica.

DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO

Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Item III, o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO não efetivou até a presente data o depósito da parcela no montante de R\$ 9.011.193,36 (nove milhões, onze mil cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos); com prazo previsto para até o último dia útil do mês de novembro do ano de 2021.

Por meio do ofício nº 00046625369/2022 - SEMA/CTE em 03 de maio de 2022 foi solicitado o desembolso da 3ª parcela, após aprovação do 3º Relatório de Execução, no qual se apurou o comprometimento de R\$11.434.370,54 (onze milhões quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos); correspondente a 68% (sessenta e oito por cento) do montante de R\$16.883.941,05 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO.

Em 17 de maio de 2022 o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO em carta enviada ao Comitê Técnico de Execução - SEMA/CTE entre outras manifestações alega o não cumprimento do percentual mínimo previsto na Cláusula 27ª do TCSA para que fosse efetuado o pagamento do 3º aporte financeiro pretendido.

O Comitê Técnico de Execução - SEMA/CTE encaminhou por e-mail em 01/07/2022 o ofício nº 00049078117/2022 - SEMA/CTE de 14 de junho de 2022, questionando e esclarecendo as manifestações da BAMIN no documento citado acima.

Recepcionado em 22/07/2022 carta do TERCEIRO COMPROMISSÁRIO em resposta ao ofício nº 00049078117/2022-SEMA/CTE, afirmando e justificando o entendimento de que o percentual estipulado na cláusula 27ª deve ser calculado sobre o montante efetivamente pago.

DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO

O QUARTO COMPROMISSÁRIO avaliou o 1º Relatório Parcial das atividades desenvolvidas pelo Secretário Executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, comunicando a este Comitê Técnico de Execução (CTE) e ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) a aprovação da prestação de contas do OBSERVATÓRIO SOCIAL, no cumprimento da CLÁUSULA 25ª, inciso V, do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul, possibilitando a liberação da segunda parcela prevista no item 34 (Eixo 7) do Plano de Ações (Anexo 3), totalizando o montante de R\$ 150.186,56 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) repassados ao OBSERVATÓRIO SOCIAL.

Cumprido ressaltar, contudo, que este Comitê Técnico de Execução (CTE) aguarda resposta ao Ofício nº 00040389498/2021 - SEMA/CTE, encaminhado em 15 de dezembro de 2021, referente à solicitação dirigida ao Município de Ilhéus para apresentação de relatório circunstanciado sobre a implementação e atividades desenvolvidas pelo Observatório Socioambiental gerido pelo Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia, para possibilitar a liberação da terceira parcela prevista no item 34 (Eixo 7) do Plano de Ações (Anexo 3).

DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O presente detalhamento foi realizado considerando os valores comprovados na 4ª Prestação de Contas, acumulando com os valores anteriormente comprovados e considerando também os pagamentos efetuados no período posterior, compreendido entre 01 de junho de 2022 a 30 de setembro de 2022.

Ressaltamos que ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 3519-X, o montante de R\$ R\$ 6.842.812,44 (seis milhões oitocentos e quarenta e dois mil oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) e o montante de R\$ 10.041.128,61 (dez milhões quarenta e um mil cento e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), referentes à primeira e segunda parcelas, respectivamente, totalizando R\$ 16.883.941,05 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e três mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos) depositados pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO, foram aplicados em duas carteiras apresentando rentabilidade líquida de R\$ 932.074,18 (novecentos e trinta e dois mil setenta e quatro reais e dezoito centavos) acumulados em 31/05/2022. Evoluindo até 31/08/2022 para o montante de R\$ 1.249.939,20 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Financeiro – Acompanhamento Mensal (em R\$)



TCSA - PORTO SUL
Acompanhamento FINANCEIRO



Periodo	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
ago/20	R\$ 6.758.395,02	R\$ 84.417,42	R\$ 9.756,83	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 9.603,83	R\$ -	R\$ 159,44	R\$ 6.852.263,27
set/20	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.686,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.686,34	R\$ -	R\$ 159,44	R\$ 6.858.949,61
out/20	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.750,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.750,38	R\$ -	R\$ 159,44	R\$ 6.869.699,99
nov/20	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.075,99	R\$ -	R\$ 5.175,54	R\$ 6.900,45	R\$ -	R\$ 159,44	R\$ 6.876.600,44
1ª PC				R\$ 153,00	R\$ 5.175,54	R\$ 33.941,00			R\$ 6.876.600,44
dez/20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.413,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.413,63	R\$ -	R\$ 159,44	R\$ 6.891.014,07
jan/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.136,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.136,21	R\$ -	R\$ 159,44	R\$ 6.903.150,28
fev/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.669,16	R\$ 8,20	R\$ -	R\$ 9.660,96	R\$ 75.093,28	R\$ 109,26	R\$ 6.837.709,76
mar/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.141,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.141,48	R\$ -	R\$ 109,26	R\$ 6.854.851,24
abr/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.397,16	R\$ 8,20	R\$ -	R\$ 15.388,96	R\$ 35.970,74	R\$ 478,80	R\$ 6.834.261,26
mai/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.559,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.559,35	R\$ 570.234,34	R\$ 7.722,86	R\$ 6.271.586,27
2ª PC				R\$ 16,40	R\$ -	R\$ 76.300,59	R\$ 681.298,36		R\$ 6.271.755,67
jun/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.144,03	R\$ 11,60	R\$ -	R\$ 23.132,43	R\$ 535.598,49	R\$ 4.368,86	R\$ 5.759.108,61
jul/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.933,14	R\$ 6,80	R\$ -	R\$ 19.926,34	R\$ 393.546,87	R\$ 5.462,84	R\$ 5.385.481,28
ago/21	R\$ 9.011.193,36	R\$ 1.029.935,25	R\$ 24.508,42	R\$ 16,40	R\$ -	R\$ 24.492,02	R\$ 8.000,00	R\$ 10.041.129,10	R\$ 15.443.085,51
set/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.674,42	R\$ 8,20	R\$ -	R\$ 60.666,22	R\$ 242.445,42	R\$ 4.391,72	R\$ 15.261.298,11
out/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.957,08	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 73.953,68	R\$ 261.889,99	R\$ 180,80	R\$ 15.073.358,40
nov/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.653,49	R\$ 3,40	R\$ 40.401,46	R\$ 52.248,63	R\$ 87.226,07	R\$ 628,79	R\$ 15.038.377,56
3ª pc				R\$ 49,80	R\$ 40.401,46	R\$ 254.419,32	R\$ 1.528.706,84		R\$ 15.038.596,76

TCSA - PORTO SUL
Acompanhamento FINANCEIRO

Periodo	Aporte de recurso	Correção Monetária	Rendimentos BRUTO (CDB+Fundos)	Tarifas de Serv Bancário	IRRF + TAXA SAÍDA	Rendimento Líquido	TOTAL PAGO	SALDO EM CONTA-CORRENTE	SALDO CONSOLIDADO
dez/21	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.769,07	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 117.704,87	R\$ 578.983,57	R\$ 4.017,66	R\$ 14.577.034,66
jan/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.293,50	R\$ 67,60	R\$ -	R\$ 104.225,90	R\$ 1.540.229,32	R\$ 1.983,08	R\$ 13.140.963,64
fev/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.752,75	R\$ 59,00	R\$ 11.251,03	R\$ 91.442,72	R\$ 573.856,37	R\$ 194,85	R\$ 12.658.490,99
mar/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.753,03	R\$ 19,80	R\$ -	R\$ 119.733,23	R\$ 357.754,10	R\$ 1.584,23	R\$ 12.420.450,32
abr/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.429,90	R\$ 51,20	R\$ -	R\$ 98.378,70	R\$ 1.011.966,54	R\$ 1.001,50	R\$ 11.506.811,28
mai/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.899,46	R\$ 39,60	R\$ 87.932,01	R\$ 35.927,85	R\$ 239.274,42	R\$ 1.890,91	R\$ 11.303.425,11
4a pc				R\$ 301,40	R\$ 99.183,04	R\$ 567.413,27	R\$ 4.302.064,32		R\$ 11.303.945,72
jun/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.041,60	R\$ 28,00	R\$ 1.683,67	R\$ 113.329,93	R\$ 319.737,42	R\$ 313,94	R\$ 11.096.989,62
jul/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.483,82	R\$ 56,00	R\$ 21.376,95	R\$ 90.050,87	R\$ 687.189,39	R\$ 555,53	R\$ 10.499.795,10
ago/22	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.515,62	R\$ 31,40	R\$ -	R\$ 114.484,22	R\$ 565.874,36	R\$ 760,27	R\$ 10.048.373,56
set/22						R\$ -	R\$ 644.091,37		R\$ 9.404.282,19
				R\$ 115,40	R\$ 23.060,62	R\$ 317.865,02	R\$ 2.216.892,54		
dez/22						R\$ -			
TOTAL	R\$ 15.769.588,38	R\$ 1.114.352,67	R\$ 1.418.395,86	R\$ 636,00	R\$ 167.820,66	R\$ 1.249.939,20	R\$ 8.728.962,06		
		R\$ 16.883.941,05				R\$ 1.249.939,20			
SALDO DISPONÍVEL									R\$ 9.404.282,19

Pagamentos Acumulados	Periodo	Valor	Acumulado	% de Execução/Aporte
	até a 4a prestação de Contas (31/05/2022)		R\$ 6.512.069,52	38,57%
	no período de 01/06/22 a 30/09/2022	R\$ 2.216.892,54	R\$ 8.728.962,06	51,70%

Gráfico 1 – Aportes Efetivados (em R\$)


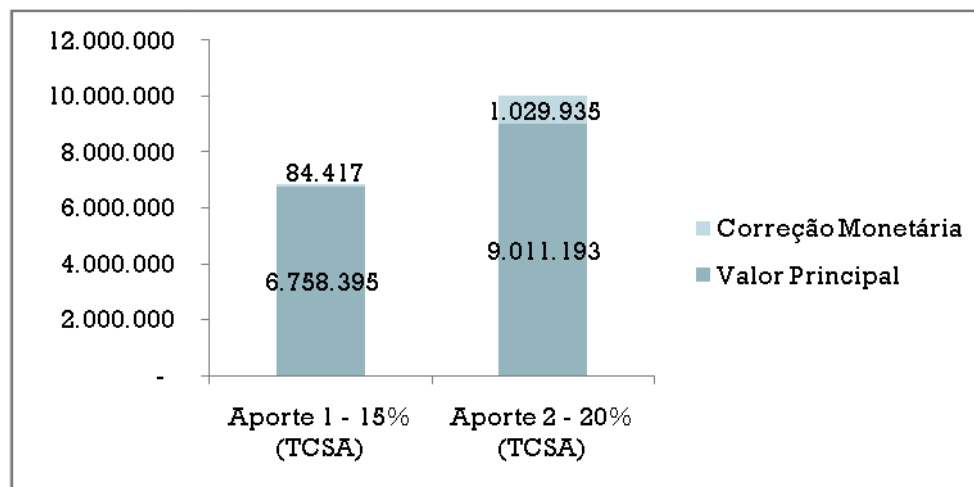



Gráfico 2 – Rendimento de Aplicação (em R\$)

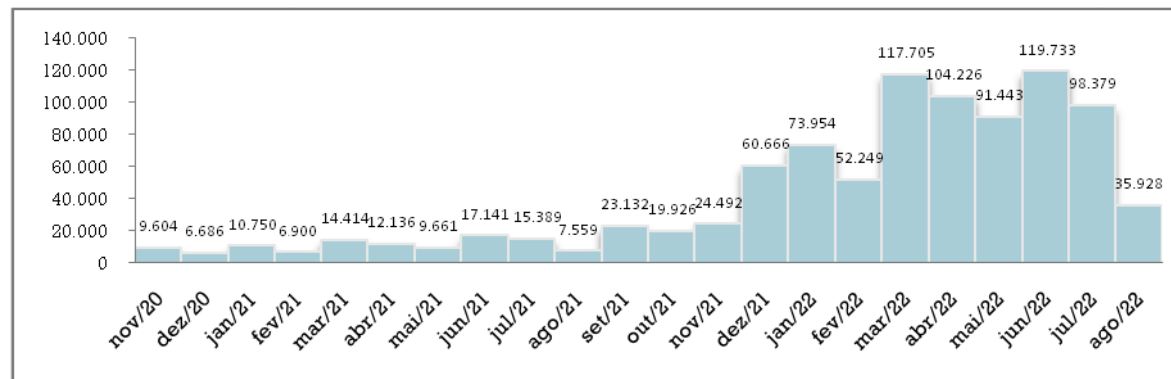

Na 4ª prestação de contas apresentada pelo FUNBIO foram comprovados pagamentos no montante de R\$ 4.302.064,32 (quatro milhões trezentos e dois mil sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que somados aos anteriores na ordem de R\$ 2.210.005,20 (dois milhões duzentos e dez mil cinco reais e vinte centavos), totalizam R\$ 6.512.069,52 (seis milhões quinhentos e doze mil sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), correspondendo a 38,57% pagos.


Assim, adicionando-se os pagamentos do período de 01/06/2022 a 30/09/2022, na ordem de R\$2.216.892,54 obtemos o total de R\$8.728.962,06 atingindo a margem de 51,70% executada em relação ao total de aportes.

Gráfico 3 – Total Comprometido x Aportado (em R\$):

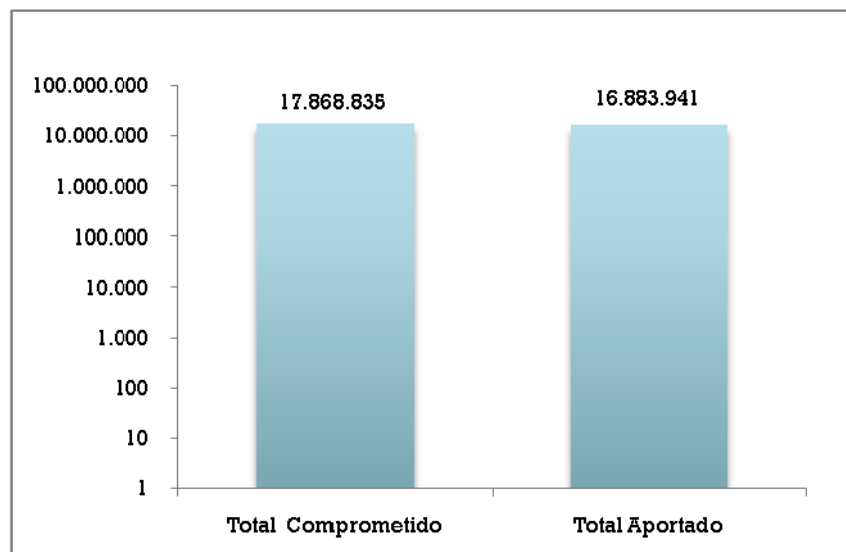

Posição em 30/09/2022

Gráfico 4 – Total Executado x Aportado (em R\$):

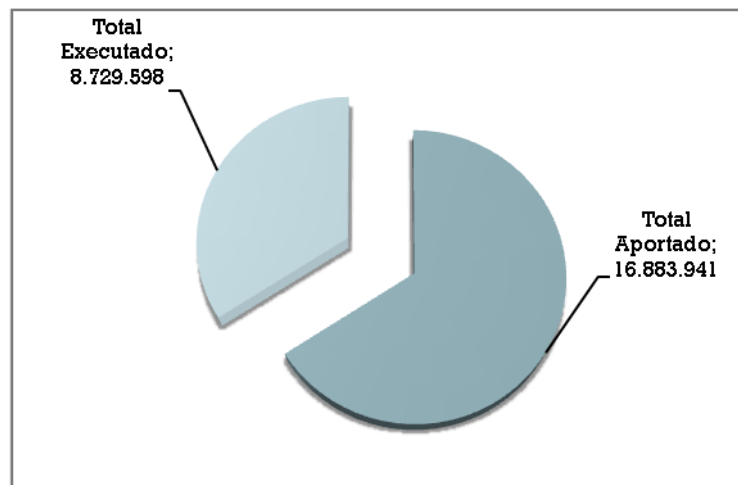

Posição em 30/09/2022

Tabela 1 – Percentual de Execução do TCSA






Total	R\$
Comprometido	17.868.835,26
Aportado	16.883.941,05
EXECUTADO	8.729.598,06
% comprometido x Aportado%	105,83%
% Executado x Aportado%	51,70%

ANEXO I - Plano de Ações Atualizado

AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência	R\$3.500.000,00		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00			
Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	R\$2.000.000,00			R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00		
Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos	R\$297.450,00	R\$297.450,00					
Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos	R\$348.750,00	R\$348.750,00					
Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	R\$770.000,00		R\$770.000,00				
Item 6 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	R\$390.000,00		R\$390.000,00				
Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	R\$780.000,00				R\$780.000,00		
Item 08 - Aquisição de serviço de imagens de alta resolução	R\$961.920,00			R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00	R\$240.480,00
Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal	R\$2.059.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00
Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	R\$1.560.000,00				R\$780.000,00	R\$780.000,00	

Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais denominada SEIA	R\$3.900.000,00		R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00		
Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$3.120.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00	R\$1.040.000,00			
Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema)	R\$1.393.400,00	R\$ 1.393.400,00					
Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	R\$1.141.100,00	R\$570.550,00	R\$ 570.550,00				
Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	R\$539.000,00		R\$ 539.000,00				
Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	R\$500.000,00			R\$500.000,00			
Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$1.000.000,00			R\$1.000.000,00			
Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00					
Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00					
Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$200.000,00			R\$200.000,00			
Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$200.000,00			R\$200.000,00			
Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$400.000,00		R\$400.000,00				

Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$100.000,00			R\$100.000,00			
Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$500.000,00		R\$500.000,00				
Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$325.000,00		R\$325.000,00				
Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$325.000,00		R\$325.000,00				
Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$1.100.000,00						R\$ 1.100.000,00
Item 29 - Destinação de recursos para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	R\$6.000.000,00			R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para adequação do CETAS Marinho	R\$400.000,00				R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho	R\$1.835.037,60					R\$917.518,80	R\$917.518,80
Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção do CETAS Marinho	R\$200.000,00					R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação	R\$1.403.952,87			R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	
Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental	R\$450.559,67	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28
TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES	R\$ 40.550.370,14	R\$ 6.418.443,28	R\$ 8.827.843,28	R\$ 9.716.757,57	R\$ 6.686.757,57	R\$ 4.624.276,37	R\$ 4.276.292,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%) ESTIMADA	R\$ 4.505.596,68	R\$ 675.839,50	R\$ 901.119,34	R\$ 901.119,34	R\$ 675.839,50	R\$ 675.839,50	R\$ 675.839,50

LEGENDA	
	Sem alterações
	Sugestão de remanejamento (supressão)
	Sugestão de remanejamento (inclusão)
	Sugestão de redistribuição de valores
	Montantes comprometidos

ANEXO II – Parecer Técnico

Consoante previsto na CLÁUSULA 6ª, inciso VI, foram identificadas por este Comitê Técnico de Execução (CTE) necessidades de ajustes no cronograma de execução preliminar constante do Plano de Ações (Anexo 3) do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) PortoSul, com vistas à melhor execução das ações estabelecidas, culminando em proposta de alterações nos itens 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29e 33. Cumpre ressaltar que as alterações efetuadas não implicam em mudanças no escopo das ações previstas no TCSA, sendo, portanto, relativas apenas aos ajustes orçamentários e de cronograma, especialmente em virtude de dificuldades e imprevistos operacionais inerentes ao gerenciamento de qualquer projeto.

ITEM 1

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 1: PLANEJAMENTO TERRITORIAL Produção de Dados Primários de Uso e Ocupação do Solo e Vegetação	Item 1 – Fortalecimento Dos Corredores Ecológicos – Contratação de serviço para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água.	Contratação de serviço para a realização da caracterização socioambiental de imóveis rurais (posses e propriedades) localizados no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio Almada e da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa de Itacaré - Serra Grande, <u>para subsidiar ações de regularização ambiental, preservação voluntária de vegetação nativa acima dos limites legalmente estabelecidos e recuperação de áreas degradadas.</u> Para a caracterização socioambiental deverão ser coletados dados geoespaciais de pontos relevantes, como os limites individualizados dos imóveis, as Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal; as áreas habitadas, com especificação das formas de utilização da terra nestas áreas, as quais serão utilizadas para a confecção de mapas temáticos e como subsídio para o planejamento, indicando eventuais incompatibilidades entre os objetivos e zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental (APA).			R\$3.500.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
\	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	R\$875.000,00	\
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
\	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	\	\	\

JUSTIFICATIVAS:

Considerando o levantamento de dados primários visando o fortalecimento do corredores ecológicos na Região de Referência deste Termo de Compromisso Socioambiental - TCSA possui estreita relação com proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23 e 25), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado, entendemos que a redistribuição de valores se faz necessária, para possibilitar o levantamento conjunto dos dados primários que serão produzidos no item 1 (uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água).

Na oportunidade, esclarecemos que se encontra em andamento a atualização tecnológica do Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos – SEIA para possibilitar a recepção dos dados primários que serão produzidos.

ITEM 3

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários – Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados primários	Item 3 – Aquisição e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Hidrológicos	Aquisição e Instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Hidrológicos, com o objetivo de monitoramento e produção de indicadores ambientais de qualidade e quantidade de água, de maneira a orientar as ações de prevenção, mitigação, compensação e conservação pelos mais diversos atores da região de referência, como sociedade civil, empreendedores e governo. Os dados serão disponibilizados de maneira ampla e automática aos COMPROMITENTES, bem como a qualquer interessado, através do Sistema SEIA monitoramento, com acesso no sítio eletrônico: http://monitoramento.seia.ba.gov.br			R\$ 273.825,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$297.450,00					

SITUAÇÃO:

Os equipamentos referentes ao Item 3, objetivando o monitoramento hidrológico, foram instalados em campo entre os meses de agosto e outubro de 2021. No entanto, em um primeiro momento as transmissões destes não atendiam ao nível de qualidade de sinal exigido no Termo de Referência, o que retardou o aceite.

Já no final do mês de dezembro de 2021, devido às chuvas expressivas ocorridas no sul do estado, parte desta rede de equipamentos sofreu avarias, sobretudo em relação aos sensores responsáveis pela medição do nível dos rios, o que necessitou de reparados por parte da empresa fornecedora, a Ativa Soluções. Após isto, em fevereiro de 2022, o sensor de nível da estação localizada no município de Itapé, na localidade da Estiva de Baixo, apresentou novamente problema neste sensor. No momento, aguarda-se solução por parte da empresa. As demais estações, localizadas em Una e Itaju do Colônia, estão operando normalmente, e os dados de chuva e nível do rio podem ser acessados através do endereço eletrônico <http://monitoramento.seia.ba.gov.br>

ITEM 4

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários – Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados primários	Item 4 – Aquisição e instalação de Plataformas Automáticas de Coleta de Dados Pluviométricos	Aquisição e Instalação de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos, com o objetivo de monitoramento e produção de indicadores ambientais de qualidade e quantidade de água, de maneira a orientar as ações de prevenção, mitigação, compensação e conservação, planos de bacias, pelos mais diversos atores da região de referência, como sociedade civil, empreendedores e governo. Os dados serão disponibilizados de maneira ampla e automática aos COMPROMITENTES, bem como a qualquer interessado, através do Sistema SEIA monitoramento, com acesso no sítio eletrônico: http://monitoramento.seia.ba.gov.br			R\$ 449.725,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$348.750,00					

SITUAÇÃO:

Os equipamentos referentes ao Item 4, objetivando o monitoramento pluviométrico, foram instalados em campo entre os meses de agosto e outubro de 2021. No entanto, em um primeiro momento as transmissões destes não atendiam ao nível de sinal exigido no TR, o que retardou o aceite. Já no final do mês de dezembro de 2021, devido às chuvas expressivas ocorridas no sul do estado, parte desta rede de equipamentos sofreu avarias, o que necessitou de reparados por parte da empresa fornecedora, a Ativa Soluções. Atualmente todas as cinco estações referentes a este Item – Uruçuca, Buararema, Almadina, Firmino Alves e Floresta Azul, encontram-se transmitindo normalmente, e os dados de chuva, temperatura e umidade relativa do ar podem ser acessados através do endereço eletrônico <http://monitoramento.seia.ba.gov.br>

ITEM 5

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários – Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados primários	Item 5 – Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMRs) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMRs) para Coleta de Dados da Qualidade da Água, com o objetivo de monitoramento e produção de indicadores ambientais qualidade e quantidade de água, de maneira a orientar as ações de prevenção, mitigação, compensação e conservação, planos de bacias, pelos mais diversos atores da região de referência, como sociedade civil, empreendedores e governo. Os dados serão disponibilizados de maneira ampla e automática aos COMPROMITENTES, bem como a qualquer interessado, através do Sistema SEIA monitoramento, com acesso no sítio eletrônico: http://monitoramento.seia.ba.gov.br			R\$ 770.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$770.000,00				

JUSTIFICATIVAS:

A proposta enviada pela empresa Hexis Científica S.A., através da Tomada de Preços Ampla Nacional 078/2022 do FUNBIO, para fornecimento e manutenção de UMRs (Item 5) foi de R\$1.558.495,97, valor significativamente acima dos R\$770.000,00 originalmente orçados, o que inviabilizou a aquisição nesta fase. Ressalta-se que recentemente foram solicitados novos orçamentos para empresas fornecedoras destes equipamentos, a fim de que sejam realizadas modificações no Termo de Referência que permitam a adequação ao montante disponível.

ITEM 6

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários – Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados primários	Item 6 – Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	Contratação de serviço de consultoria especializada para monitoramento da água, para análise de consistência de dados, definição de curvas-chave e medições de vazão, com enfoque na região de referência.			R\$390.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$390.000,00				

JUSTIFICATIVAS:

Inicialmente previa-se a contratação de Consultoria Pessoa Física para a realização deste serviço, porém, após sugestão do FUNBIO, o Termo de Referência foi modificado para a contratação de Pessoa Jurídica. A menor proposta apresentada, enviada pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, montou R\$674.163,00, valor aproximadamente 72% acima dos R\$390.000,00 originalmente orçados, o que inviabilizou a contratação nesta fase. Ressalta-se que foram realizadas modificações no Termo de Referência a fim de permitir a contratação deste serviço com o montante disponível. No momento, aguarda-se uma nova seleção.

ITEM 7

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 07 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação envolvendo um Time de desenvolvimento por 12 meses, para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal com enfoque na região de referência. OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$ 780.000,00
ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	R\$ 780.000,00	R\$ 780.000,00	/	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	/	R\$ 780.000,00	/	/

JUSTIFICATIVAS:

Considerando a previsão de execução de projeto interno que contempla a atualização inicial do aplicativo do TerraAmazon, a realocação de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) proposta do item 7 para o item 11 buscou uma melhor execução dos recursos financeiros disponíveis.

Não obstante, importante ressaltar que a alteração proposta não implicará em prejuízo nas atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da cobertura vegetal prevista no item 9, com início no ano 01.

ITEM 9

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 2: MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL Produção de Dados Primários - Serviços técnicos especializados para produção e tratamento de dados Primários	Item 09 – Contratação de serviço de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal	Contratação de serviço de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal por 72 meses, com o objetivo de monitorar a ocupação e o uso dos recursos naturais com vistas à manutenção de corredores ecológicos que possibilitem a manutenção do fluxo gênico e o movimento da biota, para enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação desordenada.			R\$ 1.816.571,38
ANOS DE EXECUÇÃO – PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 363.314,28	R\$ 363.314,28	R\$ 363.314,28	R\$ 363.314,28	R\$ 363.314,28

JUSTIFICATIVAS:

As atividades de monitoramento e enfrentamento do desmatamento ilegal e da ocupação desordenada, contempladas com a contratação de consultoria especializada no monitoramento da cobertura vegetal prevista no item 9, com início em dezembro de 2021.

O projeto Harpia no âmbito do TCSA Porto Sul está compreendido na ampliação do monitoramento de perda de vegetação nativa na faixa litorânea do Estado da Bahia. Diante desse objetivo, os produtos previstos neste projeto são referentes ao estado inicial dos remanescentes de vegetação nativa e sua consequente perda, durante a passagem do tempo. O primeiro lote contratado, referente ao passado, é o tempo zero (T0) de referência do monitoramento e o segundolote é o monitoramento de decremento quase em tempo real.

Ressaltamos que dos 138.894 km², correspondente a área de abrangência do primeiro lote contratado, foram executados 133.168,87 km², correspondente a 95,88%. Vale destacar que a não execução integral do Lote 1 ocorreu devido a necessidade de reajuste da sua área de abrangência, posterior a execução do contrato, o que gerou um excedente de área de 4.22%.

ITENS 10 e 12

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 10 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação por 24 meses para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos com enfoque na região de referência, com o objetivo de detectar, alertar e publicar de maneira contínua, sistemática e didática, áreas com provável decréto de vegetação nativa e pontos com redução da qualidade/quantidade da água, orientando e munindo os agentes de fiscalização ambiental a que se refere o TCSA, de informações de alta precisão. OBS.: Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			R\$3.261.604,22
	Item 12 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 48 meses) para aprimoramento das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com a inserção das informações específicas da região de referência sobre regras de uso e ocupação do solo, bem como das áreas restritas, com a respectiva melhoria de escala, de modo a subsidiar a gestão ambiental e a tomada de decisão. <ul style="list-style-type: none"> • A integração das plataformas GeoBahia e seu Módulo de Avaliação Ambiental Preliminar – MAP, com emissão permanente de alertas <i>on line</i> de supressão de vegetação, aos COMPROMITENTES e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO; • Publicação contínua e sistemática das áreas de decréto de vegetação, em especial a nativa, nas UCs e nas áreas de referência, entre todos os Entes Federativos e aos integrantes do PLANO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO. Todo o sistema de bens de infraestrutura de Software e Hardware necessário para a sustentação das ações de Tecnologia da Informação (TI) a que se refere o CAPÍTULO V, deverá apresentar mecanismos de segurança e inviolabilidade do armazenamento dos dados, bem como auditoria para rastreabilidade que permita que sejam armazenados e recuperados os registros dos usuários responsáveis pela alimentação, alteração e/ou exclusão de dados.			
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (item 10)	ANO 2 (item 10)	ANO 3 (item 10)	ANO 4 (item 10)	ANO 5 (item 10)	ANO 6 (item 10)
/	/	R\$780.000,00	R\$780.000,00	/	/
ANO 1 (item 12)	ANO 2 (item 12)	ANO 3 (item 12)	ANO 4 (item 12)	ANO 5 (item 12)	ANO 6 (item 12)
/	/	/	/	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.560.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1 (item 10)	ANO 2 (item 10)	ANO 3 (item 10)	ANO 4 (item 10)	ANO 5 (item 10)	ANO 6 (item 10)
/	/	/	R\$ 652.320,85	R\$ 652.320,85	/
ANO 1 (item 12)	ANO 2 (item 12)	ANO 3 (item 12)	ANO 4 (item 12)	ANO 5 (item 12)	ANO 6 (item 12)
R\$ 652.320,85	R\$ 652.320,85	R\$ 652.320,85	/	/	/

SITUAÇÃO:

Considerando que a reestruturação da ferramenta base de informações espaciais ambientais (SigWebGeobahia) alicerçará todos os demais projetos que por sua natureza utilizarão os dados e informações espaciais, imprescindível o início imediato do item 12 nos anos 01 a 03, para permitir não somente a publicação dos dados e informações geoespaciais do Item 10 (Painel de Monitoramentos), como também a operacionalização dos Itens 01 (CEFIR), 09 (Monitoramento da Cobertura Vegetal) e 11 (SEIA – Dados Espaciais).

Ante o exposto, esclarecemos que a contratação dos itens 10 e 12 foi efetivada de maneira unificada, possibilitando a otimização de recursos e manutenção de equipe previamente capacitada na interface do SigWeb Geobahia por um período mínimo de 60 meses.

A contratação prevê a atualização tecnológica do SigWeb Geobahia, bem como o desenvolvimento de novas funcionalidades, listadas a seguir:

- Atualização tecnológica dos módulos do Geobahia;
- Atualização da interface de usuário possibilitando melhor organização das informações e melhor experiência dos usuários no uso das ferramentas e módulos do Geobahia;
- Desenvolvimento de análise automatizada de consultas espaciais;
- Criação de novas ferramentas de apoio à análise técnica ambiental;
- Disponibilização de temas e serviços ambientais tais como: base hidrográfica Ottocodificada, mapeamento da cobertura vegetal, unidades de conservação, Área de Proteção Permanente de veredas, cadastro de imóveis rurais (CEFIR), monitoramento de barragens, decrementos florestais detectados e fiscalizados através do projeto Harpia;
- Módulo de Administração para gestão dos dados e controles de usuários e permissões.

Ressaltamos que 35% do total dos resultados esperados já foram alcançados, através das entregas realizadas no âmbito do Projeto Geobahia. Convém ressaltar a existência de etapas ainda não iniciadas, que envolvem manipulação de tabela de atributos, inserção de operadores, disponibilização de link de serviço e download das camadas do catálogo e simbologia por Ranger.

ITEM 11

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 3: AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA Serviços Técnicos Especializados para Integração do Monitoramento, Controle e Fiscalização Ambiental	Item 11 – Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma SEIA	Contratação de serviço de consultoria especializada em Tecnologia da Informação (mínimo por 24 meses) para aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos –SEIA, de maneira a tornar mais consistente o posterior publicização as informações sobre os empreendimentos licenciados pelo Estado com enfoque na região de referência.			R\$3.972.853,44
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$1.560.000,00	R\$1.560.000,00	/	/	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	R\$ 1.324.284,48	R\$ 1.324.284,48	R\$ 1.324.284,48	/	/

SITUAÇÃO:

Em razão da complexidade e especificidade, e visando garantir a devida evolução necessária da plataforma do Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos – SEIA às demandas deste TCSA Porto Sul, procedemos com a contratação de um time ágil – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste, por 36 (trinta e seis) meses, com o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – “Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal.

O escopo das atividades a serem desenvolvidas foi dividido em 02 (dois) grupos: Estabilização do CEFIR e Desenvolvimento do Módulo de Dados Concedidos

Para proceder com a atualização tecnológica do SEIA, foi necessária a remodelagem básica do banco de dados do módulo CEFIR, com o intuito de melhorar o desempenho, manutenibilidade e escalabilidade, otimizar recursos e aumentar a segurança. Esta etapa tem sido denominada de Estabilização do CEFIR. A etapa de estabilização do CEFIR é predecessora e necessária para que o sistema esteja compatível à integração com o SIGWEB Geobahia.

Ressaltamos que 72% do total dos resultados esperados no âmbito do Projeto de Estabilização do CEFIR/SEIA já foram alcançados. Convém ressaltar que as etapas 12, 13 e 14, ainda não iniciadas, envolvem a refatoração do código do sistema GEOSEIA, para atender a nova remodelagem das tabelas do banco de dados, a realização de testes referente à remodelagem do banco de dados e a implantação em ambiente de produção.

ITEM 14

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 14 – Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação de todos os seguimentos responsáveis pela fiscalização na região de referência, quais sejam, IBAMA, ICMBIO, INEMA, DPA.			R\$1.007.489,76
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67	R\$ 380.366,67	/	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 550.570,00	R\$ 550.570,00	/	/	/	/

SITUAÇÃO:

Os valores correspondentes ao item 14 foram remanejados para a adequação às disponibilidades orçamentárias e antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos.

Contudo, a variação cambial superior a 64% (sessenta e quatro por cento) na cotação de veículos em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do item 14, em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis.

ITEM 15

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS APORTADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 15 – Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação dos órgãos ambientais dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré.			R\$751.404,07
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$269.500,00	R\$269.500,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
	R\$ 751.404,07				

SITUAÇÃO:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondente ao item 15, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os entes municipais com atribuição fiscalizatória ambiental aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 15 para o ano 2. Ademais, a variação cambial em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços em 2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõem as especificações do item supracitado, exigindo a deliberação do Comitê Técnico de Execução (CTE) para a adequação e suplementação com recursos oriundos dos rendimentos mensais decorrentes das aplicações (em conta) dos aportes anuais para sua aquisição, nos termos da CLÁUSULA 28ª.

ITEM 16

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 16 – Aquisição de bens para estruturação da Polícia Rodoviária Federal	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a estruturação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para fiscalização na região de referência, sobretudo tráfico de madeira e de animais. OBS.: Animais ameaçados de extinção da lista vermelha, competência da Justiça Federal.			R\$ 500.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$250.000,00	R\$250.000,00	/	/	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	R\$500.000,00	/	/	/

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 16 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 16 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação das Polícias Federal e Rodoviária Federal, no valor estimado de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de postergação da ação.

ITEM 17

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 4: FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	Item 17 – Apoio estruturante ao Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus	Aquisição e doação de equipamentos que contribuam para a qualificação e estruturação do Pelotão da Costa do Cacau da CIPPA Porto Seguro, situado no Município de Ilhéus.			R\$1.000.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00				
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
		R\$ 1.000.000,00			

JUSTIFICATIVA:

As ações do Eixo 4 - Fortalecimento da Fiscalização, correspondentes aos itens 16 a 17, inicialmente previstas com início para o Ano 1, não puderam ser iniciadas de imediato por guardarem estreita relação com o Protocolo Integrado de Fiscalização Ambiental e necessidade de formalização de acordo de cooperação com os órgãos com atribuição fiscalizatória ambiental eventualmente aderentes ao referido Protocolo, sendo necessária, portanto, a prorrogação das aquisições de bens para estruturação da fiscalização inicialmente previstas no item 17 para o ano 3.

Ademais, os itens referentes à estruturação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental/Porto Seguro – CIPPA/Porto Seguro, no valor estimado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ainda não foram especificados, o que reforça a necessidade de postergação da ação.

ITENS 22, 23, 25, 26 e 27

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 22 - contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência apresentado.			R\$500.000,00
	Item 23 - contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	Elaboração de Estudo visando revisão dos diversos elementos do Plano de Manejo da APA Itacaré Serra Grande: Diagnóstico, Zoneamento Ambiental e Plano de Gestão, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.			R\$400.000,00
	Item 25 - contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	Contratação de serviço gráfico para as ações de demarcação e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru, de acordo com as descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.			R\$500.000,00
	Item 26 - contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulla	Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos relacionados à identificação de bens e serviços oferecidos ou com potencial para serem oferecidos pelo PEPT, em especial aqueles relacionados ao uso da biodiversidade, e posterior elaboração do Plano de Uso Público, que tem como objetivo ordenar, direcionar e estabelecer as atividades de uso público para o PEPT, e também de realçar e valorizar seus atributos naturais e culturais, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.			R\$350.000,00
	Item 27 - contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos relacionados à identificação de bens e serviços oferecidos ou com potencial para serem oferecidos pelo PESC, em especial aqueles relacionados ao uso da biodiversidade, e posterior elaboração do Plano de Uso Público, que tem como objetivo ordenar, direcionar e estabelecer as atividades de uso público para o PESC, e também de realçar e valorizar seus atributos naturais e culturais, de acordo com descrições técnicas especificadas em Termo de Referência a ser apresentado.			R\$350.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3 (Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
/	/	R\$500.000,00	/	/	/
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3 (Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
/	/	R\$400.000,00	/	/	/
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3 (Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
/	/	R\$500.000,00	/	/	/
ANO 1 (Item 26)	ANO 2 (Item 26)	ANO 3 (Item 26)	ANO 4 (Item 26)	ANO 5 (Item 26)	ANO 6 (Item 26)
/	/	/	R\$350.000,00	/	/
ANO 1 (Item 27)	ANO 2 (Item 27)	ANO 3 (Item 27)	ANO 4 (Item 27)	ANO 5 (Item 27)	ANO 6 (Item 27)
/	/	/	R\$350.000,00	/	/
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					

ANO 1 (Item 22)	ANO 2 (Item 22)	ANO 3(Item 22)	ANO 4 (Item 22)	ANO 5 (Item 22)	ANO 6 (Item 22)
	R\$500.000,00				
ANO 1 (Item 23)	ANO 2 (Item 23)	ANO 3(Item 23)	ANO 4 (Item 23)	ANO 5 (Item 23)	ANO 6 (Item 23)
	R\$400.000,00				
ANO 1 (Item 25)	ANO 2 (Item 25)	ANO 3(Item 25)	ANO 4 (Item 25)	ANO 5 (Item 25)	ANO 6 (Item 25)
	R\$500.000,00				
ANO 1 (Item 26)	ANO 2 (Item 26)	ANO 3 (Item 26)	ANO 4 (Item 26)	ANO 5 (Item 26)	ANO 6 (Item 26)
	R\$350.000,00				
ANO 1 (Item 27)	ANO 2 (Item 27)	ANO 3 (Item 27)	ANO 4 (Item 27)	ANO 5 (Item 27)	ANO 6 (Item 27)
	R\$350.000,00				

JUSTIFICATIVA:

Proposta de contratação unificada dos Planos de Manejo e Planos de Uso Público das Unidades de Conservação Estaduais existentes na Região de Referência (itens 22, 23, 25, 26 e 27), objetivando a realização de um planejamento territorial integrado e a otimização dos recursos. O Termo de Referência para a contratação integrada encontra-se em fase final de elaboração.

ITEM 29

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 5: FORTALECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL DAS UCs	Item 29- Destinação de recursos para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	Destinação de recursos financeiros para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para execução de ações relacionadas às Unidades de Conservação Federais especificadas no presente Acordo Judicial, quais sejam, a Reserva Biológica de Una, o Refúgio de Vida Silvestre de Uma, e o Parque Nacional da Serra das Lontras, através de instrumento jurídico adequado a ser firmado com a Instituição Seleccionada.			R\$6.000.000,00
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1 (Item 29)	ANO 2 (Item 29)	ANO 3 (Item 29)	ANO 4 (Item 29)	ANO 5 (Item 29)	ANO 6 (Item 29)
-	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00	R\$1.200.000,00
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1 (Item 29)	ANO 2 (Item 29)	ANO 3 (Item 29)	ANO 4 (Item 29)	ANO 5 (Item 29)	ANO 6 (Item 29)
-	-	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00	R\$1.500.000,00

JUSTIFICATIVA:

Esclarecemos que ainda se encontra em tramitação no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o Processo SEI ICMBio nº 02124.001690/2021-86 para tratativas referentes ao Protocolo de Fiscalização Ambiental Integrada, especialmente ao item 14 (Eixo 4) do Anexo 3 - Plano de Ações e ao Anexo 4 - Projeto Preliminar Estruturante, bem como ao item 29 do Eixo 5 (Consolidação Territorial de Unidades de Conservação) com indicativo de estabelecimento de instrumento jurídico a ser firmado entre o ICMBio e o FUNBIO, seguindo os trâmites organizacionais do órgão federal, o que reforça a necessidade de postergação da ação.

ITEM 33

ANEXO 3 – PLANO DE AÇÃO					
ESPECIFICAÇÕES					
EIXO	AÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA			RECURSOS ESTIMADOS
EIXO 6: MEDIDA DE MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO COMPLEMENTAR À FAUNA/FLORA	Item 33 – Contratação de serviço de recomposição de vegetação	Contratação de serviço para executar a recomposição de 100 (cem) hectares de vegetação, relacionado ao plantio compensatório complementar, considerando a supressão de, no máximo, 484 ha (quatrocentos e oitenta e quatro) hectares de vegetação durante a fase de implantação do empreendimento.			R\$1.403.952,87
PROPOSTA ORIGINAL DO TCSA					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	/	R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29
PROPOSTA ALTERAÇÃO APRESENTADA PELO CTE					
ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
/	/	R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29	/

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de antecipação do início das ações relacionadas à recomposição de vegetação nativa da Mata Atlântica equivalente ao montante complementar de 100ha (cem hectares) por meio da execução das medidas previstas no Item 33 (Eixo 6), objetivando o atendimento da execução no prazo máximo de até 05 (cinco) anos a contar da homologação do TCSA, nos termos da CLÁUSULA 20ª.
