

---

---

# TCSA Porto Sul

## 2º Relatório de Execução

---

---

Comitê Técnico de Execução - CTE



Foto: Rui Rezende - Lagoa Encantada

## 2º Relatório de Execução

### TCSA Porto Sul

Nos termos da CLÁUSULA 6ª do Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) Porto Sul este Comitê Técnico de Execução (CTE) vem apresentar o 2º Relatório de Execução acerca do cumprimento das obrigações estipuladas para o primeiro ano de cumprimento do TCSA, referentes às CLÁUSULAS 4ª, 6ª, 7ª, 14ª, 21ª, 25ª, 27ª, 29ª e 31ª do TCSA e ações previstas no Eixo 2 - Monitoramento e Controle Ambiental (itens 3, 4 e 9), no Eixo 3 - Avaliação Ambiental Integrada (itens 10, 12 e 13), no Eixo 5 - Fortalecimento da Consolidação Territorial das Unidades de Conservação (itens 18 e 19) e no Eixo 7 - Governança Ambiental (item 34), considerando a atualização proposta para o Plano de Ações (ANEXO I).

Cumprido esclarecer que as alterações propostas para o Plano de Ações não implicam em mudanças na natureza das obrigações, nem sequer no escopo das ações previstas no TCSA Porto Sul, sendo, portanto, relativas apenas a ajustes de cronograma e realocação de recursos entre as ações, prerrogativa deste Comitê Técnico de Execução (CTE), nos termos da Cláusula 6ª, inciso VI do TCSA, pelos motivos a seguir expostos.

Considerando o aquecimento do mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que culminou na expressiva demanda por mão de obra qualificada e especializada, principalmente diante do trabalho na modalidade home office – quebra das barreiras geográficas. Considerando a necessidade de equipe técnica mínima e necessária para execução das atividades – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end. Considerando a necessidade de otimização dos recursos, diante de orçamento previsto para a realidade de 2018 – quando das tratativas finais do TCSA Porto Sul. Procedemos com a devida contratação conjunta dos itens 10 e 12, respectivamente, “Desenvolvimento dos Painéis de Monitoramento” e “Aprimoramento das Plataformas Espaciais”.

Já em relação à contratação do item 11 – “Aperfeiçoamento da Plataforma de Informações Ambientais (SEIA), dada a sua complexidade e especificidade, procedemos com a contratação de um time ágil – Product Owner, Analista Sênior, Analista Back-end, Analista Front-end, Analista Teste –, visando garantir a devida evolução necessária às demandas deste TCSA Porto Sul. Importante reforçar que diante do aquecimento do mercado de TIC, se apresentou necessário o remanejamento de parte dos recursos financeiros do item 07 – “Aperfeiçoamento das Plataformas de Monitoramento da Cobertura Vegetal”.

Ademais, considerando a alta dos insumos no mercado da construção civil, identificamos a necessidade de antecipar a disponibilização dos recursos previstos para o item 18, visando viabilizar a contratação do serviço de cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha para conter o avanço das invasões que poderiam prejudicar o sucesso das ações de recuperação de áreas degradadas a serem realizadas com recursos externos ao TCSA Porto Sul.

Ante o exposto, objetivando a adequação às disponibilidades orçamentárias anuais correspondentes aos aportes previstos, indicamos a possibilidade de antecipação da aquisição dos bens para estruturação da fiscalização previstos no item 14.

Outrossim, nos termos da CLÁUSULA 29ª, cumpre comunicar aos COMPROMITENTES e COMPROMISSÁRIOS que a variação cambial superior a 50% na cotação dos equipamentos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) – normalmente precificados em dólar – em comparação aos valores orçados, quando da composição dos preços do Item 13, em 07/11/2018, comprometeu a aquisição do conjunto de equipamentos que compõe a especificação do item supracitado, exigindo a adequação para aquisição dos itens aos recursos disponíveis.

Na oportunidade, informamos o atendimento da execução correspondente a 62,5% (sessenta e dois e meio percentuais) do valor da primeira parcela, depositado em 06 de agosto de 2020 pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO, e, por conseguinte, o alcance do percentual mínimo de execução referido no Parágrafo Terceiro da CLÁUSULA 31ª, habilitando para o repasse da segunda parcela.

## Quadro 1 - Descrição das ações em execução

EIXO	ITEM / AÇÕES	STATUS	CONTRATADA - Nº do CONTRATO
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	Contrato firmado	Ativa Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio LTDA - 080/2021
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	Contrato firmado	
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	Contrato firmado	Geoambiente Sensoriamento Remoto LTDA - 105/2021
3	ITEM 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	Contrato firmado	AVANSYS Tecnologia LTDA - 106/2021
	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	Seleção encerrada <i>Em negociação da viabilidade técnica financeira da proposta</i>	-
	ITEM 12: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aprimoramento das plataformas geoespaciais.	Contrato firmado	AVANSYS Tecnologia LTDA - 106/2021
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	Contratos firmados	COMDADOS LTDA - 063/2021 XSITE Consultoria e Tecnologia - 064/2021 CHIPCIA Informática LTDA - 073/2021
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	Edital publicado <i>Envio de propostas até 30/07</i>	-
	ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	<i>Aguardando contratação de projetista</i>	-
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	Repasse efetuado	Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia - 005/2021

Quadro 2– Discriminativo dos valores comprometidos

EIXO	ITEM / AÇÕES	Valor estimado ANO 1 (R\$)	Valor comprometido ANO 1 (R\$)	Descrição
2	ITEM 03: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos.	198.300,00	166.050,00	PCD Hidrológicas
		99.150,00	107.775,00	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento
	ITEM 04: Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos.	232.500,00	270.100,00	PCD Pluviométricas
		116.250,00	179.625,00	Serviço PJ de instalação, manutenção e treinamento
	ITEM 09: Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal.	343.200,00	737.907,10	Serviço PJ, especializada em monitoramento.
3	ITEM 10 e 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos e aprimoramento das plataformas geoespaciais.  ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	936.000,00	1.020.580,20	Serviço PJ para desenvolvimento de software
		40.000,00	35.970,74	Mesa digitalizadora
		360.000,00	268.065,39	Solução de Segurança WAF
		390.000,00	300.033,10	Solução Switch Core
		440.000,00	430.000,00	Solução Storage
7	ITEM 34: Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental.	75.093,28	75.093,28	Repasse ao Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia
-	Custos Indiretos - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)	675.839,50	684.281,21	Recuperação de Custos Indiretos do Acordo de Cooperação nº 002/2020
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3.906.332,78</b>	<b>4.275.481,02</b>	<b>==&gt; 62,5% do valor depositado</b>

**Quadro 3– Discriminativo dos valores a solicitar**

<b>EIXO</b>	<b>ITEM / AÇÕES</b>	<b>Valor estimado anual (R\$)</b>	<b>Descrição</b>
3	ITEM 11: Contratação de serviço de consultoria especializada em TI, para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais, denominada SEIA.	780.000,00	Serviço PJ para desenvolvimento de software
	ITEM 13: Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema).	359.330,77	Solução de Virtualização
5	ITEM 18: Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	1.860.000,00	Serviço PJ de cercamento do PEPT
	ITEM 19: Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha.	350.000,00	Construção da sede do PEPT
	ITENS 18 e 19: Contratação de fiscal de obra (acompanhamento cercamento e construção sede PEPT)	140.000,00	Consultoria PJ para fiscalização do cercamento e elaboração de projetos executivos e fiscalização da construção da sede do PEPT
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3.489.330,77</b>	

## **DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS**

Em atendimento ao disposto na CLÁUSULA 14ª, o PRIMEIRO e o SEGUNDO COMPROMISSÁRIOS iniciaram as tratativas junto às entidades e aos órgãos de fiscalização ambiental dos Entes Federativos que atuam na REGIÃO DE REFERÊNCIA para possibilitar a execução de forma cooperativa do PROTOCOLO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA. Neste contexto, os Municípios de Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, foram convidados a aderir ao PROTOCOLO, mediante termos de adesão, e/ou a participar do planejamento e realização de operações e demais ações relacionadas.

## **DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO COMPROMISSÁRIO**

Nos termos da CLÁUSULA 27ª, Parágrafo Terceiro, com o atendimento da execução correspondente a mais de 50% do valor depositado na primeira parcela, o TERCEIRO COMPROMISSÁRIO realizará o pagamento da parcela subsequente após apresentação deste Relatório.



## **DAS OBRIGAÇÕES DO QUARTO COMPROMISSÁRIO**

Nos termos da CLÁUSULA 25ª, inciso I, o QUARTO COMPROMISSÁRIO manifestou interesse em aderir ao PROTOCOLO INTEGRADO DE FISCALIZAÇÃO para a REGIÃO DE REFERÊNCIA.

.

## DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

O presente detalhamento foi realizado com base na 2ª Prestação de Contas, encaminhada em 29/06/2021 pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), conforme determinação trazida pela CLÁUSULA 33ª, que contém os documentos financeiros referentes ao 2º semestre de execução do projeto, cujo período relatado corresponde a 01 de dezembro de 2020 a 30 de julho de 2021.

Abaixo quadro resumo da execução do Projeto TCSA:

DESEMBOLSO ANO 1	COMPROMETIDO SERVIÇOS + DESEMBOLSO OBSERVATÓRIO		COMPROMETIDO BENS		CUSTOS FUNBIO Ago/20 a Jul/21 (D)	TOTAL COMPROMETIDO Ano 1 (A+C+D)	TOTAL COMPROMETIDO GERAL Anos 1 a 6 (B+C+D)
	Ano 1 (A)	Ano 1+6 (B)	Ano 1 (C)				
R\$ 6.842.812,44	R\$ 1.833.580,58	R\$ 7.159.239,63	R\$ 1.757.619,23	R\$ 684.281,21	R\$ 4.275.481,02	R\$ 9.601.140,07	

Ressaltamos que ao ingressar o crédito na conta corrente inscrita sob n.º 25666-8, agência 3519-X, o montante de R\$ R\$ 6.842.812,44 (seis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) depositado pelo TERCEIRO COMPROMISSÁRIO, foi aplicado em duas carteiras de rentabilidade líquida de R\$ 111.992,66 (cento e onze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), sendo: R\$ 92.087,96 (noventa e dois mil, oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) referente ao investimento BB RF LP Corporate e o valor de R\$ 19.904,70 (dezenove mil, novecentos e quatro reais e setenta centavos) aplicado no BB CDB DI.

Diante do exposto, destacamos que este Comitê Técnico de Execução (CTE) segue com atenção especial as movimentações realizadas na gestão do recurso e apresentamos a seguir dados referentes às duas carteiras de investimentos:

Apresentamos o detalhamento do comportamento durante o período de aplicação referente a carteira de investimento e sua respectiva rentabilidade:

#### INVESTIMENTO CONSOLIDADO (RF LP Corporate x BB CDB DI)

Mês	Rendimentos		Resgate	
Dezembro	R\$	15.076,93	R\$	-
Janeiro	R\$	12.762,66	R\$	-
Fevereiro	R\$	9.692,20	R\$	75.051,30
Março	R\$	17.813,32	R\$	-
Abril	R\$	16.121,72	R\$	36.348,48
Maio	R\$	17.769,05	R\$	577.478,40
Junho	R\$	22.756,78	R\$	532.256,09
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>111.992,66</b>	<b>R\$</b>	<b>1.221.134,27</b>

#### RESUMO DO RENDIMENTO E SALDO


Saldo (RF LP Corporate x BB CDB DI)	R\$	5.754.920,75
<b>Saldo em Conta</b>	<b>R\$</b>	<b>4.368,86</b>
<b>Saldo Atual - Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>5.759.289,61</b>

**BB RF LP Corporate** – apresenta valor no montante de R\$ 5.025.987,00 (cinco milhões, vinte e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais) oriundos do saldo referente ao mês de novembro de 2020 com rentabilidade, conforme variação a seguir:

#### INVESTIMENTO BB RF LP Corporate

Mês	Rendimento Bruto		Imposto de Renda		Percentual do IR	Rendimento Líquido	
Dezembro	R\$	12.128,93	R\$	-	0%	R\$	12.128,93
Janeiro	R\$	10.072,61	R\$	-	0%	R\$	10.072,61
Fevereiro	R\$	7.358,44	R\$	-	0%	R\$	7.358,44
Março	R\$	14.383,40	R\$	-	0%	R\$	14.383,40
Abril	R\$	12.588,44	R\$	-	0%	R\$	12.588,44
Maio	R\$	14.724,61	R\$	10.688,46	73%	R\$	4.036,15
Junho	R\$	20.831,53	R\$	-	0%	R\$	20.831,53
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>92.087,96</b>	<b>R\$</b>	<b>10.688,46</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>81.399,50</b>
<b>Total Líquido</b>						<b>R\$</b>	<b>5.107.386,50</b>

Abaixo demonstração gráfica:




**BB CDB DI** – valor no montante de R\$ 1.850.607,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta reais mil, seiscentos e sete reais), refere-se ao saldo de novembro de 2020, investido a partir de dezembro de 2020, apresentando rentabilidade, quadro e variação abaixo:

#### INVESTIMENTO - BB CDB DI

Mês	Rendimento Bruto	Resgate Realizado (Capital)	Resgate (Rendimento + Capital)	Tributo + Resgate	Saldo Líquido
Dezembro	R\$ 2.948,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,30	R\$ 1.852.891,70
Janeiro	R\$ 2.690,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 626,45	R\$ 1.854.955,30
Fevereiro	R\$ 2.333,76	R\$ 74.500,00	R\$ 75.051,30	R\$ 75.074,34	R\$ 1.782.214,72
Março	R\$ 3.429,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,84	R\$ 1.784.972,80
Abril	R\$ 3.533,28	R\$ 36.000,00	R\$ 36.348,48	R\$ 37.073,04	R\$ 1.751.433,04
Maio	R\$ 3.044,44	R\$ 570.000,00	R\$ 577.478,40	R\$ 576.999,64	R\$ 1.177.477,84
Junho	R\$ 1.925,25	R\$ 524.500,00	R\$ 532.256,09	R\$ 531.868,84	R\$ 647.534,25
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 19.904,70</b>	<b>R\$ 1.205.000,00</b>	<b>R\$ 1.221.134,27</b>	<b>R\$ 1.222.977,45</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>					<b>R\$ 647.534,25</b>

Abaixo demonstração gráfica:

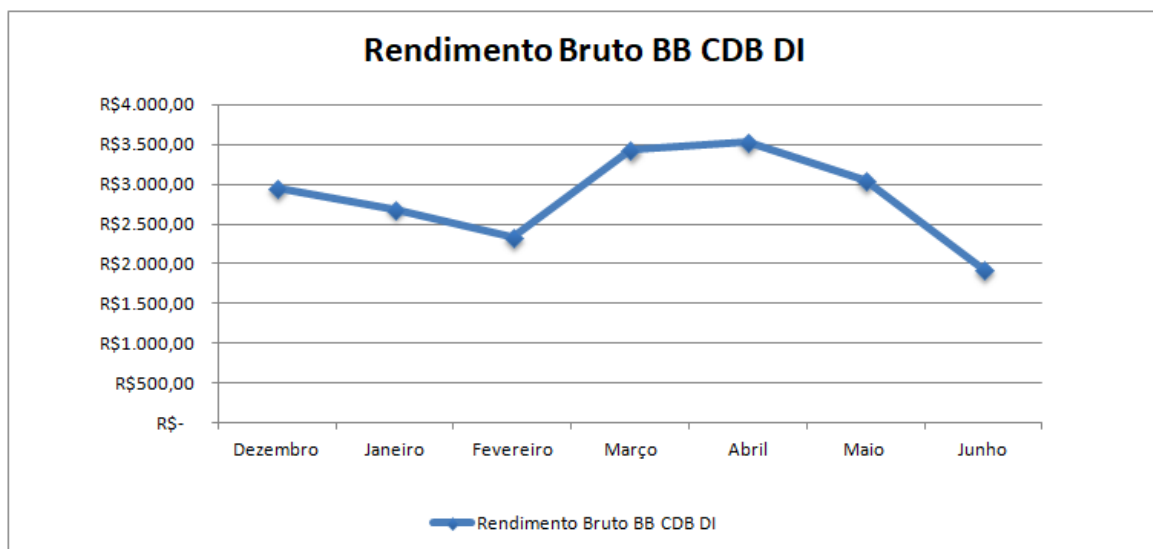

## ANEXO I – Plano de Ações

AÇÃO	RECURSOS ESTIMADOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6
Item 1 - Contratação de serviço de consultoria para levantamento dos dados primários de uso e cobertura da terra, uso da biodiversidade e da água das áreas da Região de Referência	R\$3.500.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 812.500,00	R\$ 812.500,00	R\$ 812.500,00	R\$812.500,00
Item 2 - Contratação de serviço de consultoria levantamento dos dados primários de estratificação vegetal das áreas na Região de Referência	R\$2.000.000,00			R\$1.000.000,00	R\$1.000.000,00		
Item 3 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Hidrológicos	R\$297.450,00	R\$297.450,00					
Item 4 - Aquisição, instalação e manutenção de Plataforma de Coleta Automática de Dados Pluviométricos	R\$348.750,00	R\$348.750,00					
Item 5 - Aquisição de Unidades de Monitoramento Remoto (UMR's) para Coleta de Dados da Qualidade da Água	R\$770.000,00		R\$770.000,00				
Item 6 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da água	R\$390.000,00		R\$390.000,00				
Item 07 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento das plataformas de monitoramento da cobertura vegetal	R\$780.000,00			R\$780.000,00			
Item 08 - Aquisição de imagens de alta resolução	R\$961.920,00		R\$192.384,00	R\$192.384,00	R\$192.384,00	R\$192.384,00	R\$192.384,00
Item 09 - Contratação de consultoria especializada para monitoramento da cobertura vegetal	R\$2.059.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00	R\$343.200,00
Item 10 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para desenvolvimento do Painel dos Monitoramentos	R\$1.560.000,00					R\$780.000,00	R\$780.000,00
Item 11 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aperfeiçoamento da plataforma de Informações Ambientais denominada SEIA	R\$3.900.000,00		R\$975.000,00	R\$975.000,00	R\$975.000,00	R\$975.000,00	
Item 12 - Contratação de serviço de consultoria especializada em TI para aprimoramento das plataformas geoespaciais	R\$3.120.000,00	R\$ 780.000,00	R\$780.000,00	R\$780.000,00	R\$780.000,00		

Item 13 - Aquisição de bens de infraestrutura de Hardware SEMA/INEMA (necessária para sustentar todas as ações de sistema)	R\$1.393.400,00	R\$ 1.393.400,00					
Item 14 - Aquisição de bens para estruturação da fiscalização federal, estadual e municipal	R\$1.141.100,00	R\$570.550,00	R\$ 570.550,00				
Item 15 - Aquisição de bens para estruturação dos municípios litorâneos da região de referência	R\$539.000,00		R\$ 269.500,00	R\$269.500,00			
Item 16 - Aquisição de bens para estruturação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal	R\$500.000,00		R\$ 250.000,00	R\$250.000,00			
Item 17 - Aquisição de bens para estruturação da CIPPA/Porto Seguro	R\$1.000.000,00		R\$ 500.000,00	R\$500.000,00			
Item 18 - Contratação de serviço de engenharia para cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00					
Item 19 - Contratação de serviço de engenharia para infraestrutura do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$350.000,00	R\$ 350.000,00					
Item 20 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Lagoa Encantada e Rio Almada	R\$200.000,00					R\$ 200.000,00	
Item 21 - Contratação de serviço gráfico para sinalização da APA Costa de Itacaré - Serra Grande	R\$200.000,00					R\$ 200.000,00	
Item 22 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$500.000,00			R\$ 500.000,00			
Item 23 - Contratação de serviço de consultoria para implementação do Plano de Manejo APA Itacaré Serra Grande	R\$400.000,00					R\$ 400.000,00	
Item 24 - Contratação de serviço gráfico para demarcação física e sinalização de limites do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$100.000,00					R\$ 100.000,00	
Item 25 - Contratação de serviço de consultoria para revisão do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$500.000,00			R\$ 500.000,00			
Item 26 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Ponta da Tulha	R\$325.000,00			R\$ 325.000,00			

Item 27 - Contratação de serviço de consultoria para elaboração dos Estudos Econômicos e Plano de Uso Público do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$325.000,00				R\$ 325.000,00		
Item 28 - Contratação de serviço de engenharia para recuperação e complementação da estrutura do Parque Estadual da Serra do Conduru	R\$1.100.000,00						R\$ 1.100.000,00
Item 29 - Repasse de recurso para as Unidades de Conservação Federais do Corredor - PMBE - Lontras	R\$6.000.000,00		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Item 30 - Contratação de serviço de engenharia para adequação do CETAS Marinho	R\$400.000,00				R\$200.000,00	R\$200.000,00	
Item 31 - Operacionalização do CETAS Marinho	R\$1.835.037,60					R\$917.518,80	R\$917.518,80
Item 32 - Contratação de serviço de engenharia para manutenção do CETAS Marinho	R\$200.000,00					R\$100.000,00	R\$100.000,00
Item 33 - Contratação de serviço de recomposição de vegetação	R\$1.403.952,87				R\$467.984,29	R\$467.984,29	R\$467.984,29
Item 34 - Repasse de recurso para a implementação de um Observatório Socioambiental	R\$450.559,67	R\$ 75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28	R\$75.093,28
<b>TOTAL ESTIMADO EM AÇÕES</b>	<b>R\$ 40.550.370,14</b>	R\$ 6.082.555,52	R\$ 8.110.074,03	R\$ 8.110.074,03	R\$ 6.082.555,52	R\$ 6.082.555,52	R\$ 6.082.555,52
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10%)</b>	<b>R\$ 4.505.596,68</b>	R\$ 684.281,24	R\$ 901.119,34	R\$ 901.119,34	R\$ 675.839,50	R\$ 675.839,50	R\$ 675.839,50



TOTAL PREVISTO	R\$ 45.055.966,82	R\$ 6.758.395,02	R\$ 9.011.193,36	R\$ 9.011.193,36	R\$ 6.758.395,02	R\$ 6.758.395,02	R\$ 6.758.395,02
TOTAL DEPOSITADO	R\$ 6.842.812,44	R\$ 6.842.812,44					
TOTAL DAS AÇÕES	R\$ 40.550.370,14	R\$ 6.158.443,28	R\$ 6.565.727,28	R\$ 8.502.677,28	R\$ 6.371.161,57	R\$ 6.963.680,37	R\$ 5.988.680,37
RENDIMENTO	R\$76.316,99	R\$76.316,99					
VALOR RESIDUAL	R\$ 76.404,91	R\$ 76.404,91					

LEGENDA	
	Sem alterações
	Sugestão de remanejamento
	Sugestão de remanejamento
	Sugestão de redistribuição de valores
